



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE BACIA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MÉDIO PARAÍBA DO SUL

ANO 4 - 2025

PIRH-PS


Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul



dezembro, 2025

PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul

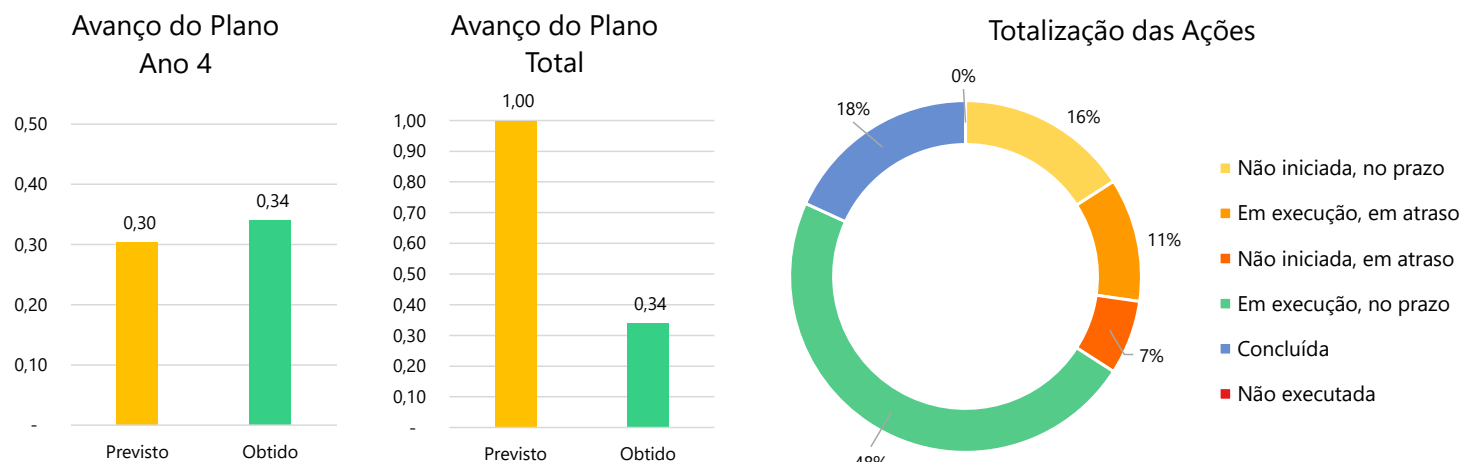


Totalização das ações		
Não iniciada, no prazo		7
Em execução, em atraso		5
Não iniciada, em atraso		3
Em execução, no prazo		21
Concluída		8
Não executada		0

Implementação	
Ano 4	112%
Acumulado	34%

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
	1.1 - Fortalecimento Institucional	1.1.1 - Compatibilização dos Interesses Internos e Externos da Bacia	1.1.1.1 - Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos	0,25	0,25	0,25	0,25				
		1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 - Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	0,25	0,25	0,25	0,50				
			1.1.2.2 - Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	0,25	1,00						
			1.1.2.3 - Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH	0,25	0,25						
			1.1.2.4 - Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão GACG	0,25	0,25						
			1.1.2.5 - Apoiar técnica e financeiramente as ações da Diretoria com vistas ao aperfeiçoamento da atuação do CBH MPS	0,25	0,25						
			1.1.2.6 - Manter interação com as prefeituras da área de abrangência da RH III, com foco em divulgar as ações do CBH e integrar os entes dos sistemas	0,25	1,00						
		1.1.3.1 - Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	0,25	0,25							

PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul

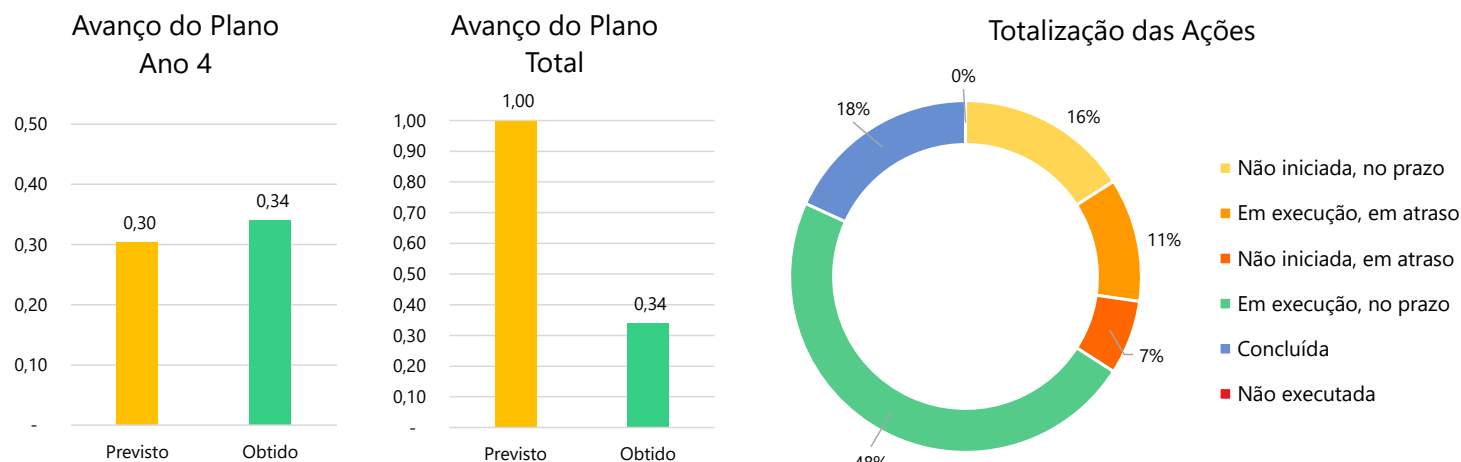


Totalização das ações		
Não iniciada, no prazo		7
Em execução, em atraso		5
Não iniciada, em atraso		3
Em execução, no prazo		21
Concluída		8
Não executada		0

Implementação	
Ano 4	112%
Acumulado	34%

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
1 - Gestão de Recursos Hídricos		1.1.3 - Aprimoramento, Fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	1.1.3.2 - Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do Contrato de Gestão	1,00	1,00	0,44	0,69			0,35	0,33
			1.1.3.3 - Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão	0,25	1,00						
			1.1.3.4 - Promover a participação dos colaboradores da Entidade Delegatária em capacitações relacionadas a recursos hídricos	0,25	0,50						
		1.2.1 - Outorga	1.2.1.1 - Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica	1,00	0,25	0,63	0,25				
			1.2.1.2 - Divulgar dados e informações referentes à outorga dos recursos hídricos na RH III	0,25	0,25						
		1.2.2 - Cobrança	1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica, em atendimento às metas do Contrato de Gestão	1,00	1,00	0,63	0,63				
			1.2.2.2 - Divulgar dados e informações referentes à cobrança pelo uso dos recursos hídricos na RH III	0,25	0,25						

PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul

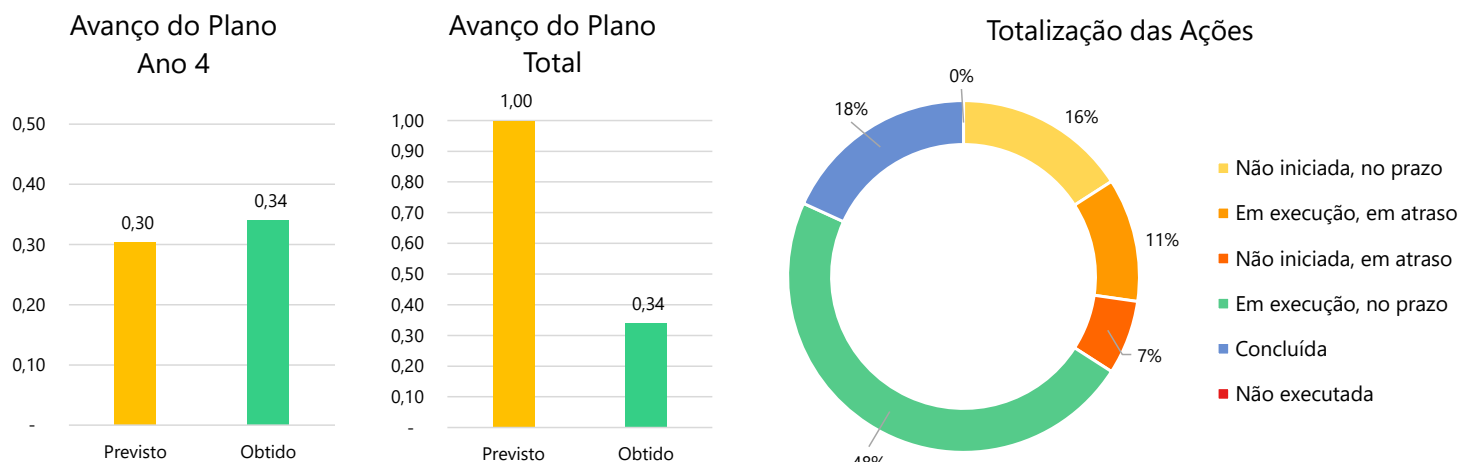



Totalização das ações		
Não iniciada, no prazo		7
Em execução, em atraso		5
Não iniciada, em atraso		3
Em execução, no prazo		21
Concluída		8
Não executada		0

Implementação	
Ano 4	112%
Acumulado	34%

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
	1.2 - Instrumentos de Gestão	1.2.3 - Enquadramento	1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	1,00	0,75	0,63	0,38	0,46	0,33		
			1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação	0,25	0,00						
		1.2.4 - Plano de Bacia Hidrográfica	1.2.4.1 - Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano	0,25	0,25	0,17	0,17				
			1.2.4.2 - Realizar atualizações periódicas do orçamento, a cada 5 anos, e atualização completa do Plano de Bacia a partir 12º ano.	0,00	0,00						
			1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH	0,25	0,25						
		1.2.5 - Sistema de Informações	1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH	0,25	0,25	0,25	0,25				
	1.3 - Unidades Especiais de Gestão (UEGs)	1.3.1 - Criação de UEGs e Indicação de Manejos Diferenciados	1.3.1.1 - Estudar, pactuar e propor a criação de Unidades Especiais de Gestão (UEGs) e definir as necessidades de manejo diferenciado e possíveis restrições de uso	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25		

PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul

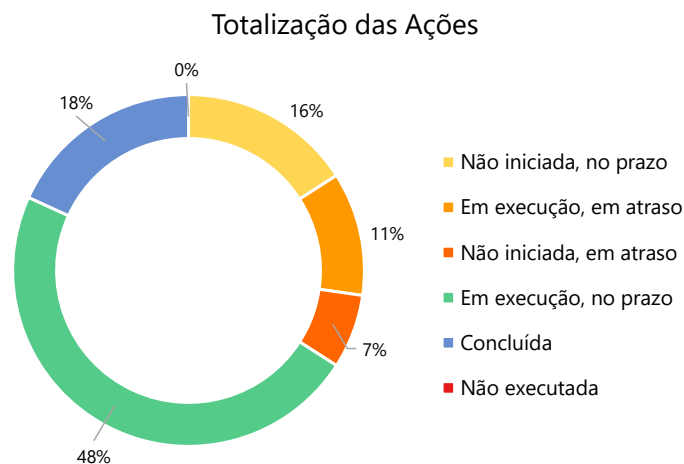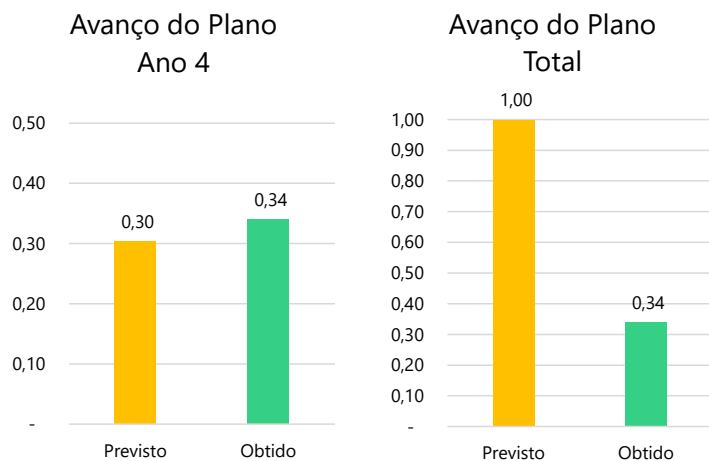

Totalização das ações

Não iniciada, no prazo	7
Em execução, em atraso	5
Não iniciada, em atraso	3
Em execução, no prazo	21
Concluída	8
Não executada	0


Implementação

Ano 4	112%
Acumulado	34%

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
	1.4 - Eventos Críticos	1.4.1 - Plano de Gerenciamento de Riscos	1.4.1.1 - Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul	0,50	1,00	0,25	0,50	0,13	0,25		
			1.4.1.2 - Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	0,00	0,00						
		1.4.2 - Ações emergenciais	-	0,00	0,00	0,00	0,00				

PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul

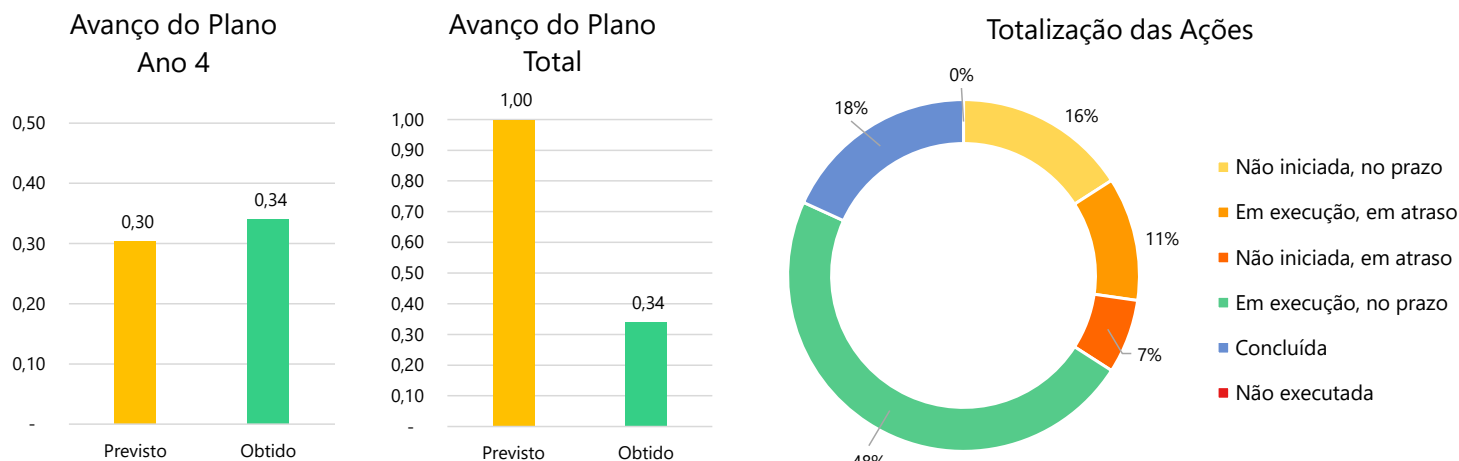

Totalização das ações

Não iniciada, no prazo	7
Em execução, em atraso	5
Não iniciada, em atraso	3
Em execução, no prazo	21
Concluída	8
Não executada	0


Implementação

Ano 4	112%
Acumulado	34%

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativos	2.1 - Água Superficial	2.1.1 - Equacionamento de Problemas de Balanço Hídrico Quali-quantitativo	2.1.1.1 - Subsidiar a elaboração do estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,21
	2.2 - Água Subterrânea	2.2.1 - Uso Sustentável da Água Subterrânea	2.2.1.1 - Subsidiar a elaboração do estudo sobre a água subterrânea na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial e subterrânea	2.3.1 - Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa existente	2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	0,25	0,75	0,25	0,75	0,50	0,63		
		2.3.2 - Melhoria, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.1 - Desenvolver o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	1,00	0,50	0,75	0,50				
			2.3.2.2 - Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	0,50	0,50						

PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul

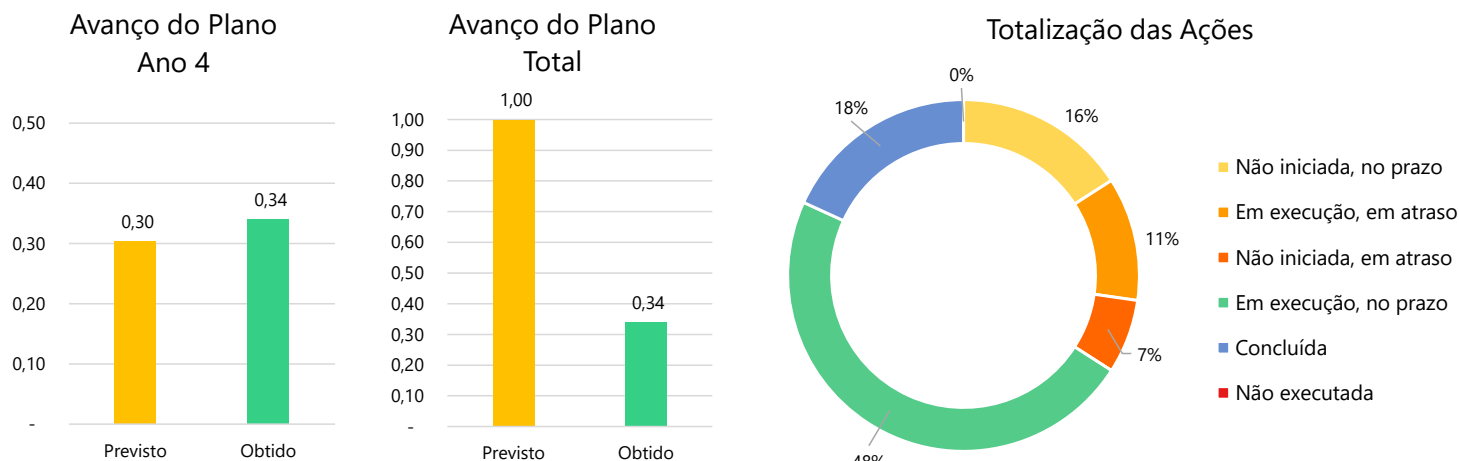

Totalização das ações		
Não iniciada, no prazo		7
Em execução, em atraso		5
Não iniciada, em atraso		3
Em execução, no prazo		21
Concluída		8
Não executada		0


Implementação	
Ano 4	112%
Acumulado	34%

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1 - Esgotamento Sanitário	3.1.1 - Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 - Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	0,25	1,00	0,17	0,67	0,17	0,67	0,06	0,22
			3.1.1.2 - Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	0,00	0,00						
			3.1.1.3 - Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP)	0,25	1,00						
	3.2 - Resíduos Sólidos	3.2.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento das Áreas de Disposição Final de Resíduos Sólidos	3.2.1.1 - Viabilizar relatório sobre resíduos sólidos para divulgação aos órgãos pertinentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3 - Drenagem Urbana	3.3.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Drenagem Urbana	3.3.1.1 - Viabilizar relatório sobre drenagem urbana para divulgação aos órgãos pertinentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul


Avanço do Plano
Ano 4

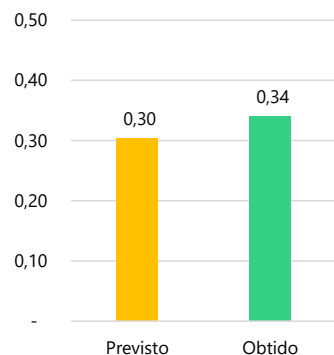

Avanço do Plano
Total

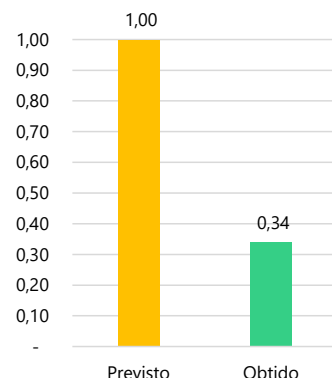

Totalização das Ações

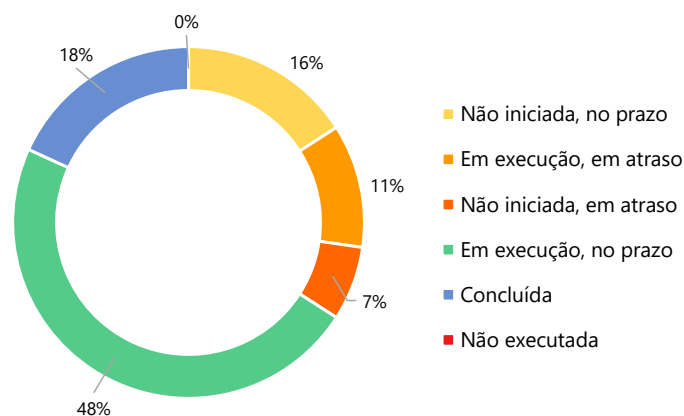

Totalização das ações

Não iniciada, no prazo	7
Em execução, em atraso	5
Não iniciada, em atraso	3
Em execução, no prazo	21
Concluída	8
Não executada	0

Implementação


Ano 4 **112%**

Acumulado **34%**

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
4 - Infraestrutura verde	4.1 - Planejamento Territorial	4.1.1 - Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias	4.1.1.1 - Formalizar a indicação de bacias hidrográficas prioritárias para elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	1,00	1,00	0,75	0,88	0,50	0,69	0,25	0,47
			4.1.1.2 - Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	0,50	0,75						
		4.1.2 - Mobilização Social visando à Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias	4.1.2.1 - Identificar, mobilizar e formalizar acordos e parcerias com vistas à execução de ações de recuperação ambiental e manejo do solo	0,25	0,50	0,25	0,50				
	4.2 - Intervenções na Paisagens	4.2.1 - Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 - Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25		

PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul

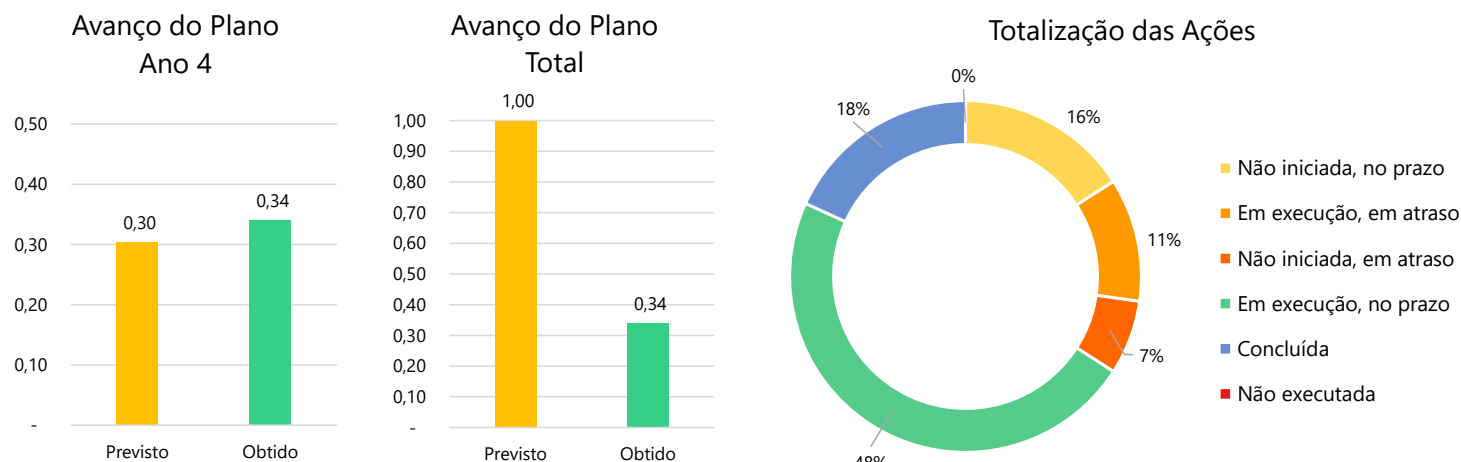


Totalização das ações		
Não iniciada, no prazo		7
Em execução, em atraso		5
Não iniciada, em atraso		3
Em execução, no prazo		21
Concluída		8
Não executada		0

Implementação	
Ano 4	112%
Acumulado	34%

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
5 - Produção de conhecimento	5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão	5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	0,25	0,50	0,25	0,50	0,63	0,38	0,63	0,38
		5.1.2 - Elaboração de Estudos Técnicos	5.1.2.1 - Realizar a atualização do Atlas de microbacias do Médio Paraíba do Sul	1,00	0,25	1,00	0,25				

PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul

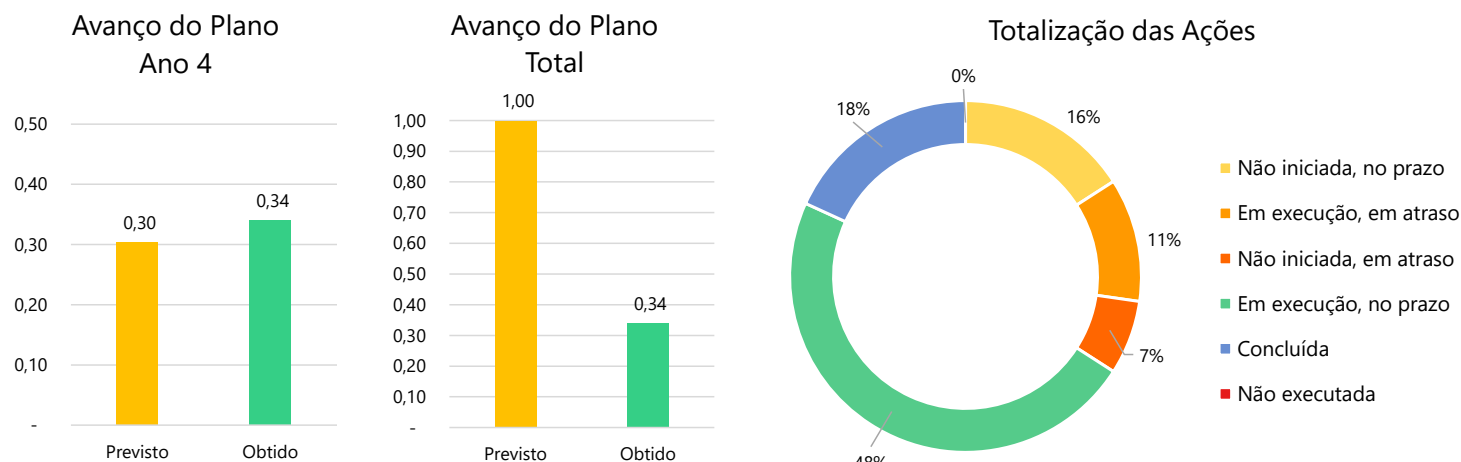

Totalização das ações		
Não iniciada, no prazo		7
Em execução, em atraso		5
Não iniciada, em atraso		3
Em execução, no prazo		21
Concluída		8
Não executada		0

Implementação	
Ano 4	112%
Acumulado	34%

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1 - Comunicação	6.1.1 - Gestão de Comunicação	6.1.1.1 - Realizar a revisão do Plano de Ações de Comunicação	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	0,44
			6.1.1.2 - Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	0,25	0,25						
	6.2 - Educação Ambiental	6.2.1 - Programa de Educação ambiental	6.2.1.1 - Elaborar o Plano de Educação Ambiental	1,00	1,00	0,50	0,63	0,50	0,63		
			6.2.1.2 - Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	0,00	0,25						
