



**AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA IMPLEMENTAÇÃO DO
PLANO DE BACIA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA
MÉDIO PARAÍBA DO SUL**

ANO 1 - 2022

PIRH-PS

Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul




janeiro, 2023


PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul


**Avanço do Plano
Ano 1**

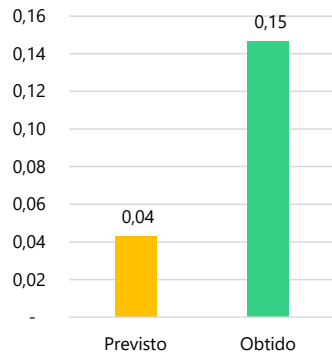

**Avanço do Plano
Total**

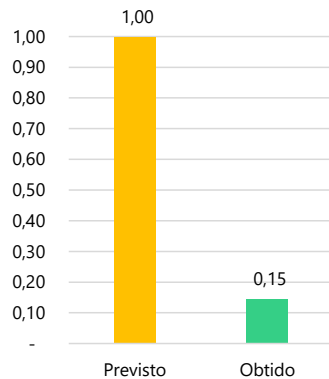

Totalização das Ações

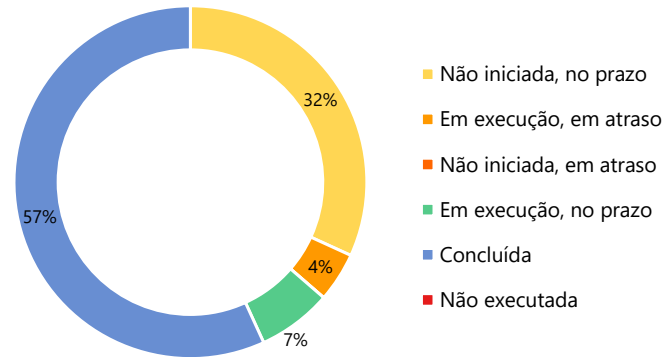

Totalização das ações

Não iniciada, no prazo	14
Em execução, em atraso	2
Não iniciada, em atraso	0
Em execução, no prazo	3
Concluída	25
Não executada	0

Implementação

Ano 1	342%
Acumulado	15%


Avaliação quantitativa

Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
				Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
1.1 - Fortalecimento Institucional		1.1.1 - Compatibilização dos Interesses Internos e Externos da Bacia	1.1.1.1 - Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.1.2.1 - Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	0,00	0,00						
			1.1.2.2 - Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	0,00	0,00						
		1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.3 - Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH	0,00	0,00	0,00	0,08				
			1.1.2.4 - Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão GACG	0,00	0,00						
			1.1.2.5 - Apoiar técnica e financeiramente as ações da Diretoria com vistas ao aperfeiçoamento da atuação do CBH MPS	0,00	0,25			0,02	0,07		
			1.1.2.6 - Manter interação com as prefeituras da área de abrangência da RH III, com foco em divulgar as ações do CBH e integrar os entes dos sistemas	0,00	0,25						
1.1.3.1 - Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	0,00	0,00									


PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul


**Avanço do Plano
Ano 1**

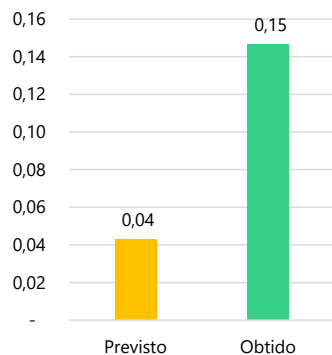

**Avanço do Plano
Total**

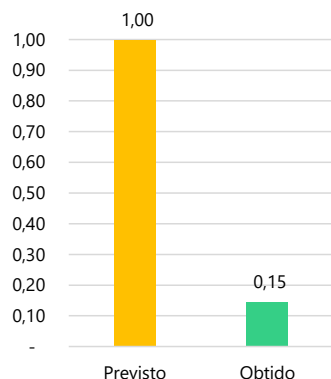

Totalização das Ações

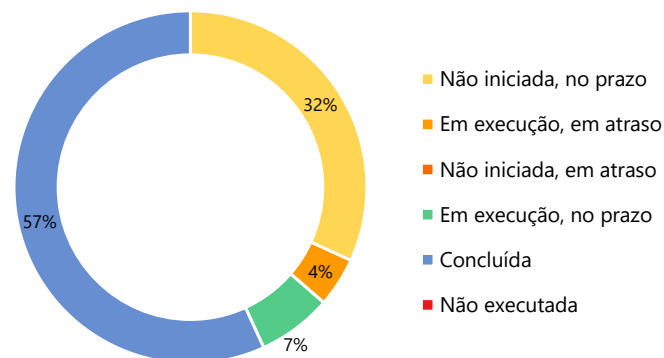

Totalização das ações

Não iniciada, no prazo	14
Em execução, em atraso	2
Não iniciada, em atraso	0
Em execução, no prazo	3
Concluída	25
Não executada	0

Implementação

Ano 1	342%
Acumulado	15%


Avaliação quantitativa

Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
				Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3 - Aprimoramento, Fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária		1.1.3.2 - Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do Contrato de Gestão	0,25	0,50	0,06	0,13			0,02	0,04
			1.1.3.3 - Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão	0,00	0,00						
			1.1.3.4 - Promover a participação dos colaboradores da Entidade Delegatária em capacitações relacionadas a recursos hídricos	0,00	0,00						
	1.2.1 - Outorga		1.2.1.1 - Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica	0,25	0,25	0,13	0,13				
			1.2.1.2 - Divulgar dados e informações referentes à outorga dos recursos hídricos na RH III	0,00	0,00						
	1.2.2 - Cobrança		1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica, em atendimento às metas do Contrato de Gestão	0,25	0,50	0,13	0,25				
			1.2.2.2 - Divulgar dados e informações referentes à cobrança pelo uso dos recursos hídricos na RH III	0,00	0,00						
1.2 - Instrumentos de Gestão	1.2.3 - Enquadramento		1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	0,00	0,25	0,00	0,13	0,05	0,10		


PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul


**Avanço do Plano
Ano 1**

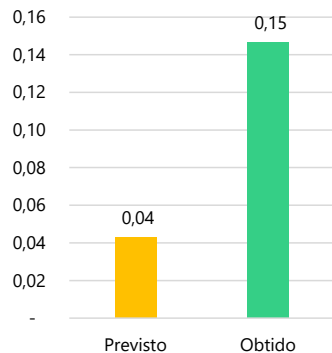

**Avanço do Plano
Total**

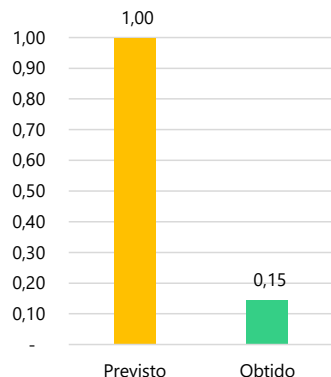

Totalização das Ações

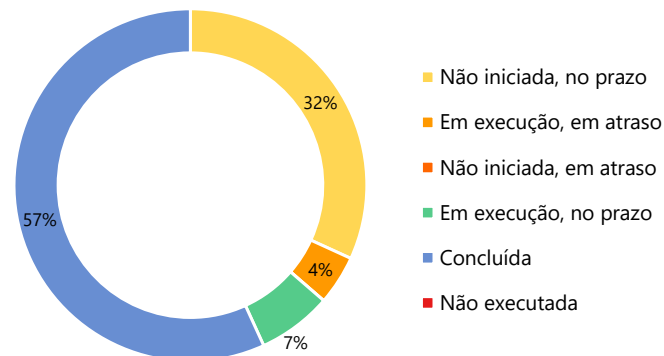

Totalização das ações

Não iniciada, no prazo	14
Em execução, em atraso	2
Não iniciada, em atraso	0
Em execução, no prazo	3
Concluída	25
Não executada	0

Implementação

Ano 1	342%
Acumulado	15%


Avaliação quantitativa

Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
				Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
	1.2 - Enquadramento	1.2.4 - Plano de Bacia Hidrográfica	1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação	0,00	0,00	0,00	0,15				
			1.2.4.1 - Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano	0,00	0,00						
			1.2.4.2 - Realizar atualizações periódicas do orçamento, a cada 5 anos, e atualização completa do Plano de Bacia a partir 12º ano.	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH	0,00	0,00						
			1.2.5 - Sistema de Informações	1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.3 - Unidades Especiais de Gestão (UEGs)	1.3.1 - Criação de UEGs e Indicação de Manejos Diferenciados	1.3.1.1 - Estudar, pactuar e propor a criação de Unidades Especiais de Gestão (UEGs) e definir as necessidades de manejo diferenciado e possíveis restrições de uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.4 - Eventos Críticos	1.4.1 - Plano de Gerenciamento de Riscos	1.4.1.1 - Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul	0,00	0,00						
			1.4.1.2 - Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.4.2 - Ações emergenciais	-	-	-	-					


PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul


**Avanço do Plano
Ano 1**

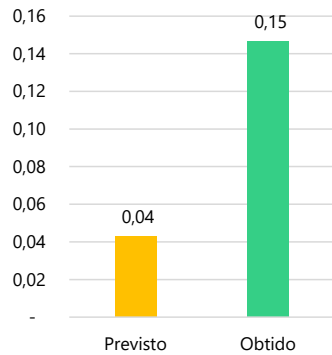

**Avanço do Plano
Total**

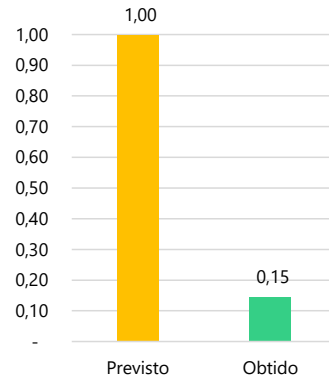

Totalização das Ações

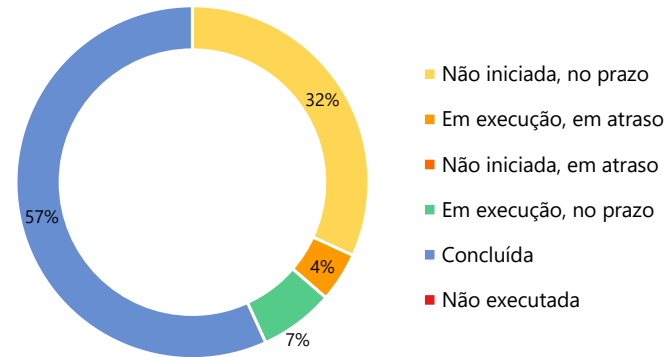

Totalização das ações

Não iniciada, no prazo	14
Em execução, em atraso	2
Não iniciada, em atraso	0
Em execução, no prazo	3
Concluída	25
Não executada	0



Implementação

Ano 1	342%
Acumulado	15%

Avaliação quantitativa

Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global		
				Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativos	2.1 - Água Superficial	2.1.1 - Equacionamento de Problemas de Balanço Hídrico Quali-quantitativo	2.1.1.1 - Subsidiar a elaboração do estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	
	2.2 - Água Subterrânea	2.2.1 - Uso Sustentável da Água Subterrânea	2.2.1.1 - Subsidiar a elaboração do estudo sobre a água subterrânea na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial e subterrânea	2.3.1 - Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa existente	2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	2.3.2.1 - Desenvolver o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	0,25	0,25	0,13	0,13	0,06			0,06
				2.3.2.2 - Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	0,00	0,00						
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1 - Esgotamento Sanitário	3.1.1 - Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 - Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	0,00	1,00	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,22	
			3.1.1.2 - Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	0,00	0,00							
			3.1.1.3 - Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP)	0,00	1,00							

PAINEL
Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul

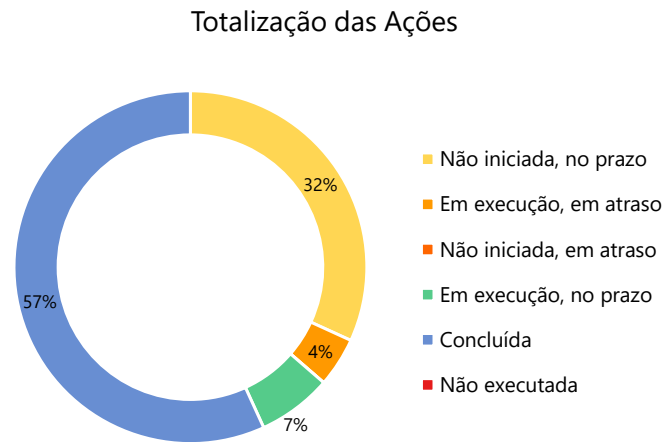
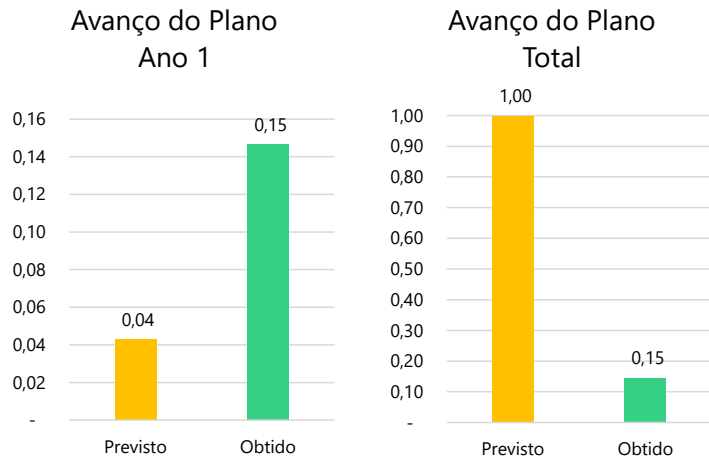


Não iniciada, no prazo	14
Em execução, em atraso	2
Não iniciada, em atraso	0
Em execução, no prazo	3
Concluída	25
Não executada	0

Implementação	
Ano 1	342%
Acumulado	15%

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
	3.2 - Resíduos Sólidos	3.2.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento das Áreas de Disposição Final de Resíduos Sólidos	3.2.1.1 - Viabilizar relatório sobre resíduos sólidos para divulgação aos órgãos pertinentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3 - Drenagem Urbana	3.3.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Drenagem Urbana	3.3.1.1 - Viabilizar relatório sobre drenagem urbana para divulgação aos órgãos pertinentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 - Infraestrutura verde	4.1 - Planejamento Territorial	4.1.1 - Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias	4.1.1.1 - Formalizar a indicação de bacias hidrográficas prioritárias para elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	0,50	1,00	0,38	0,63	0,19	0,31	0,09	0,16
			4.1.1.2 - Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	0,25	0,25						
	4.1.2 - Mobilização Social visando à Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4.2 - Intervenções na Paisagens	4.2.1 - Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 - Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 - Produção de conhecimento	5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão	5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,25
			5.1.2 - Elaboração de Estudos Técnicos	5.1.2.1 - Realizar a atualização do Atlas de microbacias do Médio Paraíba do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6.1 - Comunicação	6.1.1 - Gestão de Comunicação	6.1.1.1 - Realizar a revisão do Plano de Ações de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAINEL
Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul

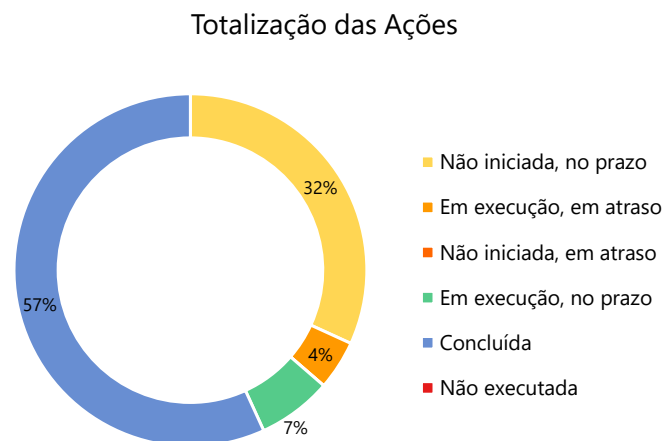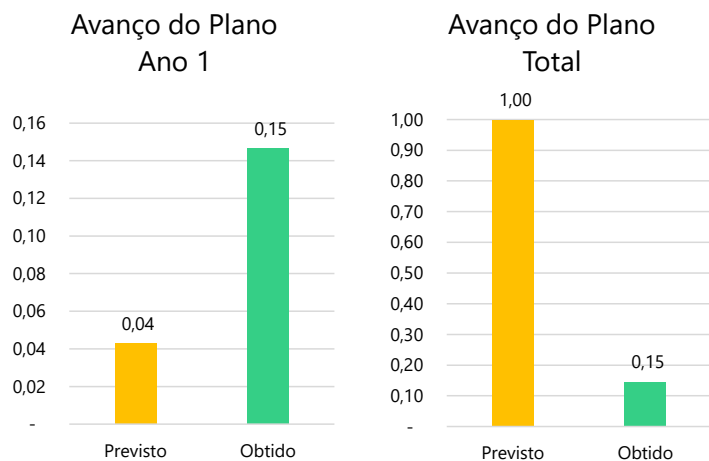

Não iniciada, no prazo	14
Em execução, em atraso	2
Não iniciada, em atraso	0
Em execução, no prazo	3
Concluída	25
Não executada	0

Implementação	
Ano 1	342%
Acumulado	15%


Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2 - Educação Ambiental	6.2.1 - Programa de Educação ambiental	6.1.1.2 - Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,19
			6.2.1.1 - Elaborar o Plano de Educação Ambiental	0,50	0,50	0,25	0,38	0,25	0,38		
			6.2.1.2 - Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	0,00	0,25						

Ação 1.1.1.1 - Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.1 - Compatibilização dos Interesses Internos e Externos da Bacia
Meta	Participação em, ao menos, 70% das reuniões nas quais o CBH possui cadeira
Atividades previstas	Participar das reuniões e propor encaminhamento; Executar os encaminhamentos.
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	Participar das reuniões e propor encaminhamento; Executar os encaminhamentos.		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma participação realizada	2022	0	0
70% de participação durante quatro anos	2025	0,25	0
70% de participação durante oito anos	2029	0,5	0
70% de participação durante doze anos	2033	0,75	0
70% de participação durante todos os anos da vigência do PBH	2036	1	0

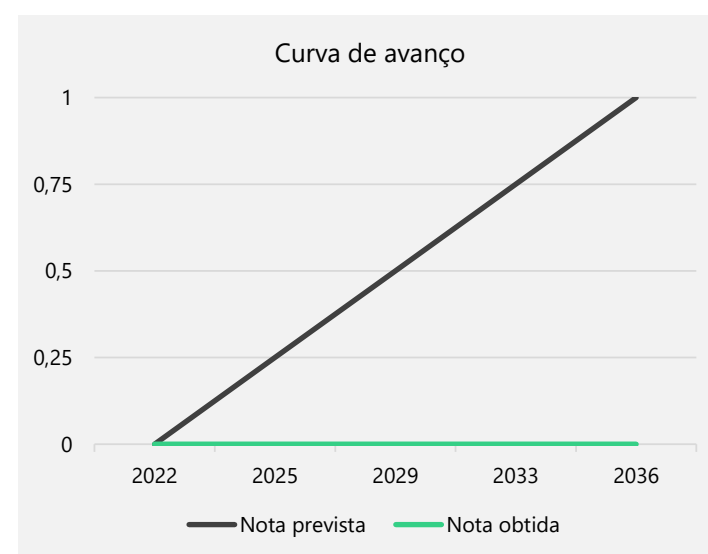


Ação 1.1.2.1 - Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê
Meta	Viabilização de 100% das solicitações de participação em eventos internos e externos
Atividades previstas	Viabilizar 100% das solicitações de participação em eventos internos e externos
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 715.500,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	Viabilizar 100% das solicitações de participação em eventos internos e externos		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma participação realizada	2022	0	0
100% das solicitações viabilizadas durante quatro anos	2025	0,25	0
100% das solicitações viabilizadas durante oito anos	2029	0,5	0
100% das solicitações viabilizadas durante doze anos	20233	0,75	0
100% das solicitações viabilizadas em todos os anos da vigência do PBH	2026	1	0

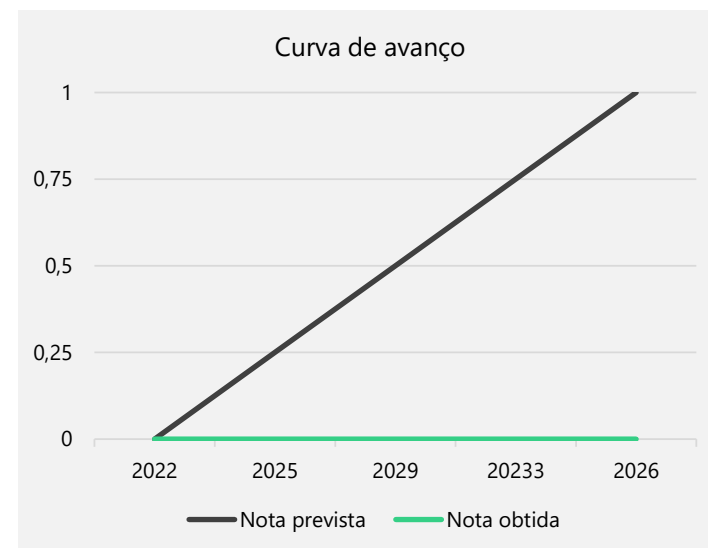


Ação 1.1.2.2 - Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê
Meta	Participação de membros do Comitê em 15 capacitações
Atividades previstas	Realizar capacitação CNARH 40 para municípios e membros interessados
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 180.000,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	Realizar capacitação CNARH 40 para municípios e membros interessados		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma participação realizada	2022	0	0
4 capacitações realizadas	2025	0,25	0
8 capacitações realizadas	2029	0,5	0
12 capacitações realizadas	20233	0,75	0
15 capacitações realizadas	2026	1	0

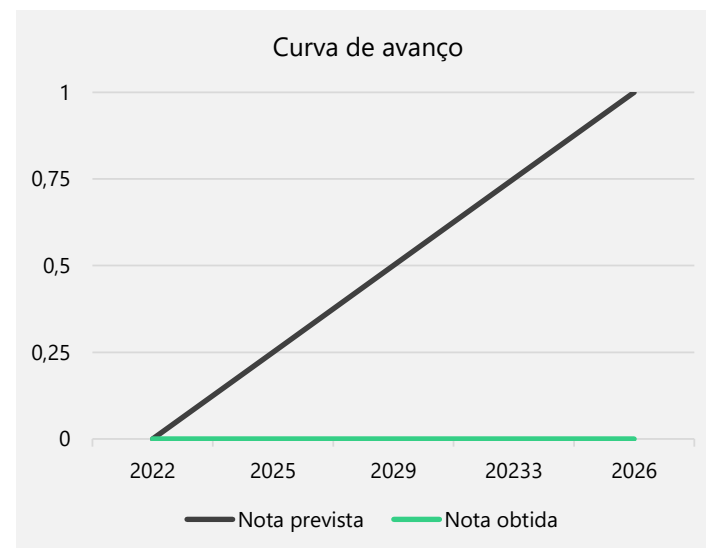


Ação 1.1.2.3 - Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê
Meta	Viabilização, custeio e mantimento do funcionamento do(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH
Atividades previstas	Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 1.950.000,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum projeto apoiado	2022	0	0
EP em funcionamento durante quatro anos	2025	0,25	0
EP em funcionamento durante oito anos	2029	0,5	0
EP em funcionamento durante doze anos	2033	0,75	0
EP em funcionamento em todos os anos da vigência do PBH	2036	1	0

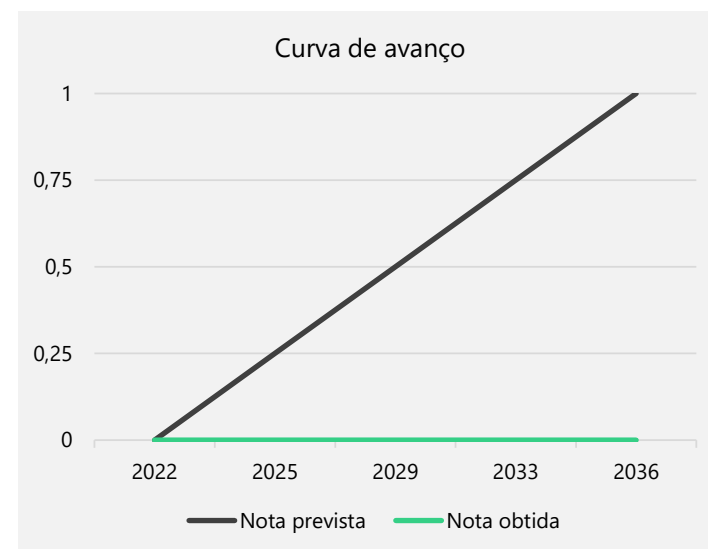


Ação 1.1.2.4 - Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão GACG

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê
Meta	Relatório anual do GACG elaborado e publicado
Atividades previstas	Organizar e apoiar a realização das reuniões do GACG
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	Organizar e apoiar a realização das reuniões do GACG		
Principais	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho				
	Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
	nenhuma atividade realizada	2022	0	0
	4 relatórios elaborados	2025	0,25	0
	8 relatórios elaborados	2029	0,5	0
	12 relatórios elaborados	2033	0,75	0
	15 relatórios elaborados	2036	1	0

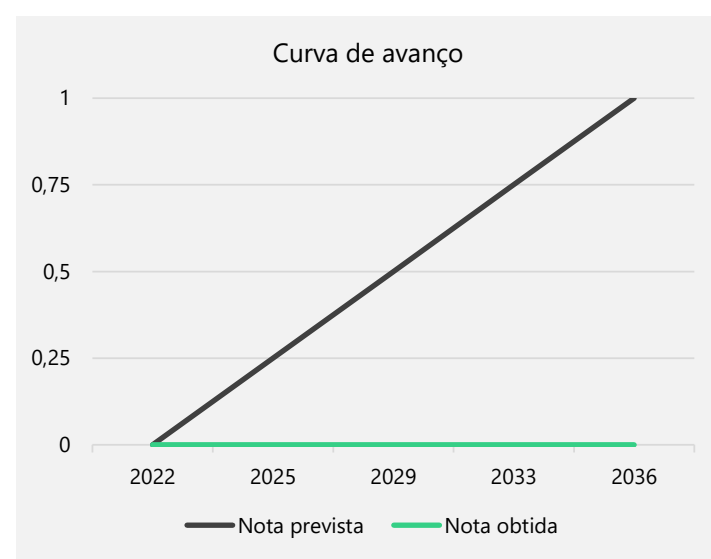

Ação 1.1.2.5 - Apoiar técnica e financeiramente as ações da Diretoria com vistas ao aperfeiçoamento da atuação do CBH MPS

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0,25
Atividades executadas	<p>Viabilizar ações sob demanda da Diretoria;</p> <p>Elaborar edital de manifestação de interesse para cessão dos lavabos</p> <p>Acompanhamento edital de manifestação de interesse para cessão dos lavabos</p> <p>O CBH-MPS, adquiriu uma sonda multiparamétrica com o objetivo de iniciar o projeto de monitoramento dos rios da RH III e realizou a capacitação de utilização da sonda por meio da empresa contratada no laboratório da UERJ / Resende/RJ, no dia 07/02/2022.</p> <p>Elaboração de cartazes a serem distribuídos para os cartórios e municípios, a fim de que sejam disponibilizados em murais para informar à população sobre o uso do solo.</p> <p>Organização da expedição em parceria com o Movimento Nascentes do Paraíba - a programação do Comitê Médio Paraíba do Sul contemplou os dias 15 e 16 de março de 2022.</p>		

Aquisição de 30 camisetas para a expedição - Recurso: Agenda 6. Subagenda 6.1 Comunicação, Programa 6 Executar ações de comunicação.

Aquisição de material de divulgação para ENCOB. *350 canecas em material ecológico e 350 TAGs em Papel Semente para distribuição no evento em conjunto com os outros 3 comitês afluentes (Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana).

Aquisição de 350 sacolas em parceria com o CEIVAP e demais comitês, para distribuição no ENCOB 2022.

Acordo de Cooperação Técnica, o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em forma de Despesas Correntes, sendo elas: material de consumo; instalação e manutenção de equipamentos diretamente relacionados ao desenvolvimento do projeto; outros serviços de terceiros (pessoa física e jurídica); e passagens e diárias.

Parceria com o projeto Mosaico de Águas para colaborar na coleta e análise das águas de rios localizados em sua área de atuação, no contexto do seu Plano de Monitoramento da Região Hidrográfica III – Médio Paraíba do Sul, durante e após o término do projeto.

Organização do X ECOB/RJ

Apoio ao X Encontro Estadual de Comitês de Bacias

Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro (ECOB) no valor de R\$ 2.895,00 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais)

Manifestação de apoio à criação do Monumento Natural Municipal Corredeiras e Piracemas do Rio Preto, pela Prefeitura de Rio das Flores (RJ), no trecho que este rio passa pelo município.

Aprovação de participação de 15 jovens da Região Hidrográfica III (RH-III) no X ECOB/RJ, que aconteceu na região do MPS, no Município de Vassouras/RJ. Com a contratação de uma van para deslocamento e ajuda de custo aos participantes.

Participação do Comitê de Monitoramento do bloco 3 da CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.


Meta	Apoio de 15 ações da diretoria técnica e financeiramente
Atividades previstas	Viabilizar ações sob demanda da Diretoria; Elaborar edital de manifestação de interesse para cessão dos lavabos; Acompanhamento edital de manifestação de interesse para cessão dos lavabos.
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 300.000,00

	Apoio ao IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul, organizado pelo CBH BPSI, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Participação em reunião ampliada para discussão sobre a situação atual da região de Visconde de Mauá (problematização), ações que vem sendo desenvolvidas/dificuldades encontradas e propostas de ações integradas, com foco no parcelamento do solo e ocupação desordenada, em conflito com a legislação agrária e a conservação da biodiversidade.
Principais constatações	-
Recomendações	-

Indicador de desempenho				
	Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
	nenhuma ação apoiada	2022	0	0,25
	4 ações apoiadas	2025	0,25	0,25
	8 ações apoiadas	2029	0,5	0,25



12 ações apoiadas	2033	0,75	0,25
15 ações apoiadas	2036	1	0,25



Ação 1.1.2.6 - Manter interação com as prefeituras da área de abrangência da RH III, com foco em divulgar as ações do CBH e integrar os entes dos sistemas

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê
Meta	Realização de 8 reuniões ou atividades com as prefeituras da RH III
Atividades previstas	Encaminhar Newsletter das ações as prefeituras da RH-III; Convidar todas as prefeituras da RH-III para a primeira reunião de cada ano, na qual é feita a divulgação do planejamento das atividades do CBH no ano.
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0,25
Atividades executadas	Encaminhar Newsletter das ações as prefeituras da RH-III; Convidar todas as prefeituras da RH-III para a primeira reunião de cada ano, na qual é feita a divulgação do planejamento das atividades do CBH no ano.		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho				
	Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
	nenhuma atividade realizada	2022	0	0,25
	2 reuniões ou atividades realizadas	2025	0,25	0
	4 reuniões ou atividades realizadas	2029	0,5	0



6 reuniões ou atividades realizadas	2033	0,75	0
8 reuniões ou atividades realizadas	2036	1	0



Ação 1.1.3.1 - Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.3 - Aprimoramento, Fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária
Meta	Viabilização dos recursos financeiros para a manutenção da Entidade Delegatária em cumprimento ao Contrato de Gestão
Atividades previstas	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 2.775.000,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
recurso aportado durante quatro anos	2025	0,25	0
recurso aportado durante oito anos	2029	0,5	0



recurso aportado durante doze anos	2033	0,75	0
recurso aportado em todos os anos da vigência do PBH	2036	1	0




Ação 1.1.3.2 - Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do Contrato de Gestão

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.3 - Aprimoramento, Fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária
Meta	Realização da revisão do fluxo de gestão entre o 1º e o 3º ano de vigência do PBH
Atividades previstas	Elaborar as especificações técnicas para a revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0,25	Nota alcançada	0,5
Atividades executadas	Elaborar as especificações técnicas para a revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0,5
especificação técnica para a revisão do fluxo de gestão e planejamento elaborada	2022	0,25	0,5
revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégicos em andamento	2023	0,5	0
revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégicos concluída	2023	0,75	0
revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégicos aprovada	2024	1	0

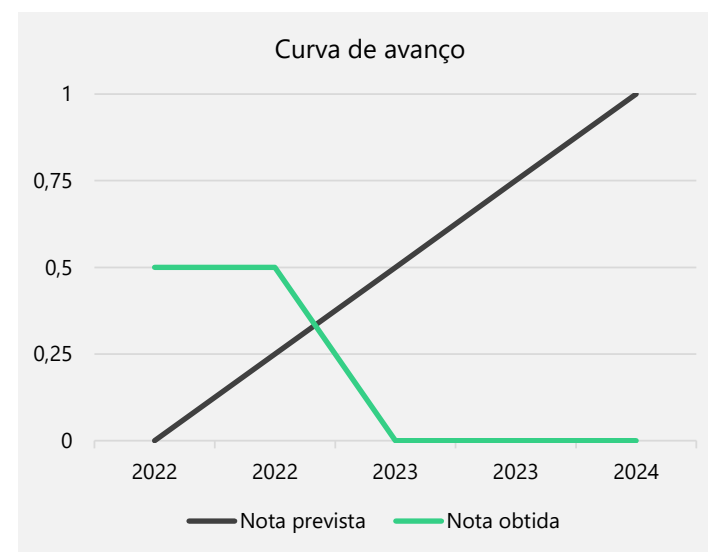


Ação 1.1.3.3 - Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão


Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.3 - Aprimoramento, Fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária
Meta	Avaliação da necessidade e possibilidade de ampliação e manutenção da estrutura da Entidade Delegatária, durante o 4º e 5º ano de implementação do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
1ª reunião de alinhamento sobre a avaliação realizada	2025	0,25	0
2ª reunião de alinhamento sobre a avaliação realizada	2025	0,5	0
avaliação em realização	2026	0,75	0

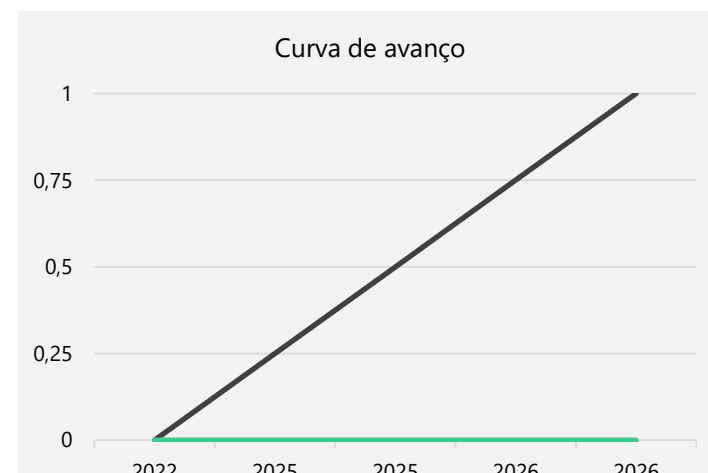

avaliação da necessidade e possibilidade da ampliação e manutenção concluída	2026	1	0
--	------	---	---




Ação 1.1.3.4 - Promover a participação dos colaboradores da Entidade Delegatária em capacitações relacionadas a recursos hídricos

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.3 - Aprimoramento, Fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária
Meta	Realização de 15 participações de colaboradores da Entidade Delegatária em capacitação relacionada a recursos hídricos
Atividades previstas	Realizar constante levantamento dos eventos e das capacitações relacionados às atividades desempenhadas pelos colaboradores Definir os colaboradores para participação no evento ou na capacitação Participar dos eventos de treinamento e capacitação Receber o certificado de realização da capacitação Acompanhar a realização das capacitações, principalmente no que tange ao atendimento das metas do CG
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	Realizar constante levantamento dos eventos e das capacitações relacionados às atividades desempenhadas pelos colaboradores Definir os colaboradores para participação no evento ou na capacitação Participar dos eventos de treinamento e capacitação Receber o certificado de realização da capacitação Acompanhar a realização das capacitações, principalmente no que tange ao atendimento das metas do CG		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Custo estimado R\$ 0,00

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma participação realizada	2022	0	0
4 participações realizadas	2025	0,25	0
8 participações realizadas	2029	0,5	0
12 participações realizadas	2033	0,75	0
15 participações realizadas	2036	1	0

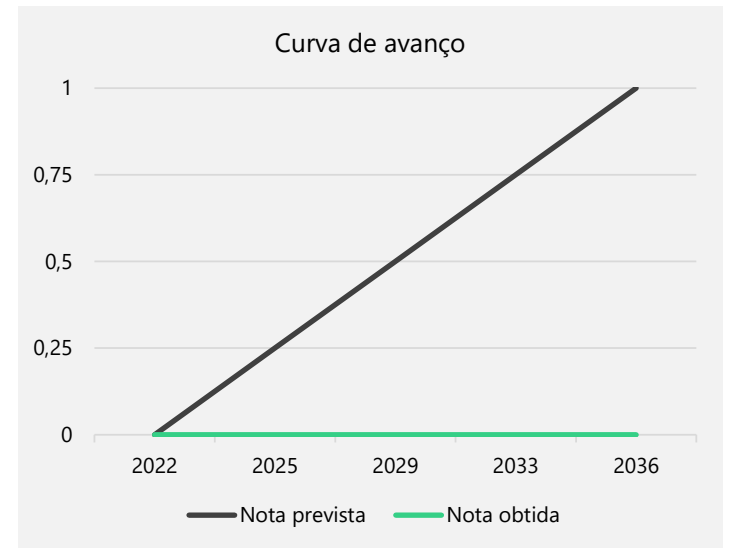

Ação 1.2.1.1 - Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica


Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.1 - Outorga
Meta	Publicação de resolução sobre as diretrizes para aperfeiçoamento do instrumento da outorga propostas pelo comitê até o 4º ano de implementação do PBH
Atividades previstas	Elaboração de Plano de Trabalho para discussão das diretrizes da outorga para execução ser iniciada no 2º ano do PBH Aprovação de Plano de Trabalho para discussão das diretrizes da outorga para execução ser iniciada no 2º ano do PBH
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, em atraso		
Nota prevista	0,25	Nota alcançada	0,25
Atividades executadas	Elaboração de Plano de Trabalho para discussão das diretrizes da outorga para execução ser iniciada no 2º ano do PBH		
Principais constatações	Pendente a aprovação do Plano de Trabalho.		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0,25
plano de trabalho definido	2022	0,25	0,25



2 oficinas realizada	2023	0,5	0
minuta de resolução apresentada ao órgão gestor	2024	0,75	0
resolução publicada	2025	1	0

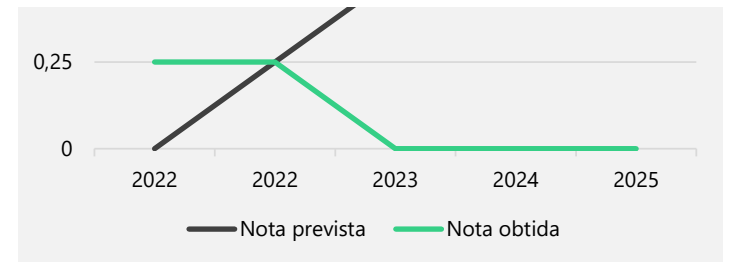


Ação 1.2.1.2 - Divulgar dados e informações referentes à outorga dos recursos hídricos na RH III

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.1 - Outorga
Meta	Realização de 15 divulgações de dados e informações referentes ao tema outorga na vigência do PBH
Atividades previstas	Solicitar dados ao INEA Realizar tratamento dos dados recebidos Realizar divulgação de dados e informações sobre outorga
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas			
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho				
	Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
	nenhuma divulgação realizada	2022	0	0
	4 divulgações realizadas	2023	0,25	0
	8 divulgações realizadas	2027	0,5	0
	12 divulgações realizadas	2023	0,75	0

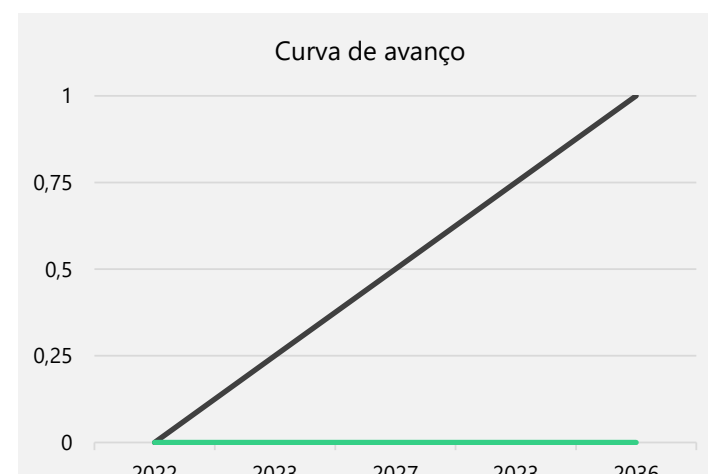

15 divulgações realizadas

2036

1

0

2022 2023 2024 2025 2030


— Nota prevista — Nota obtida

Ação 1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica, em atendimento às metas do Contrato de Gestão

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.2 - Cobrança
Meta	Publicação de resolução sobre as diretrizes para aperfeiçoamento do instrumento da cobrança propostas pelo comitê até o 3º ano de implementação do PBH
Atividades previstas	Realizar discussões sobre o estudo de impacto dos valores praticados na cobrança sobre os diferentes segmentos de usuários
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0,25	Nota alcançada	0,5
Atividades executadas	Realizar discussões sobre o estudo de impacto dos valores praticados na cobrança sobre os diferentes segmentos de usuários		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0,5
meta do CG para 2021 cumprida	2022	0,25	0
meta do CG para 2022 cumprida	2023	0,5	0
minuta de resolução apresentada ao órgão gestor	2023	0,75	0

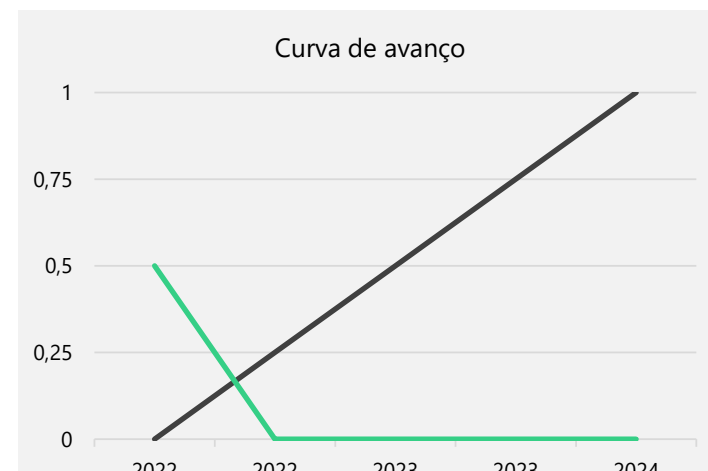


resolução publicada

2024

1

0




Ação 1.2.2.2 - Divulgar dados e informações referentes à cobrança pelo uso dos recursos hídricos na RH III

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.2 - Cobrança
Meta	Realização de 15 divulgações de dados e informações referentes ao tema cobrança na vigência do PBH
Atividades previstas	Solicitar dados ao INEA Realizar tratamento dos dados recebidos Realizar divulgação de dados e informações sobre cobrança
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	Solicitar dados ao INEA Realizar tratamento dos dados recebidos Realizar divulgação de dados e informações sobre cobrança		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma divulgação realizada	2022	0	0
4 divulgações realizadas	2025	0,25	0
8 divulgações realizadas	2029	0,5	0
12 divulgações realizadas	2033	0,75	0

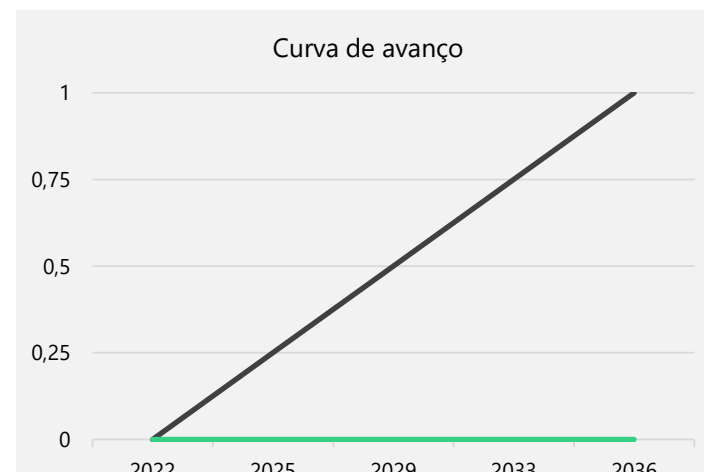

15 divulgações realizadas

2036

1

0

2022 2023 2024 2025 2026

— Nota prevista — Nota obtida

Ação 1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.3 - Enquadramento
Meta	Conclusão do estudo técnico inicial para construção da proposta de enquadramento

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0,25
Atividades executadas	<p>Enviar manifestação à ANA e aos demais órgãos gestores, solicitando a capacitação</p> <p>Confirmar e organizar a capacitação</p> <p>Participar de capacitação, organizada pela ANA e demais órgãos gestores</p> <p>Verificar a existência de possíveis áreas nos CBHs Afluentes onde já é possível avançar com o instrumento, com base nas orientações da capacitação</p> <p>Analisar a possibilidade de novos estudos técnicos para enquadramento de outros trechos</p> <p>Elaborar o termo de referência e contratar empresa para elaboração estudo da etapa técnica propositiva do Enquadramento</p>		
Principais constatações	-		

Atividades previstas	<p>Enviar manifestação à ANA e aos demais órgãos gestores, solicitando a capacitação</p> <p>Confirmar e organizar a capacitação</p> <p>Participar de capacitação, organizada pela ANA e demais órgãos gestores</p> <p>Verificar a existência de possíveis áreas nos CBHs Afluentes onde já é possível avançar com o instrumento, com base nas orientações da capacitação</p> <p>Analisar a possibilidade de novos estudos técnicos para enquadramento de outros trechos</p> <p>Propor diretrizes para especificações do TR</p> <p>Elaborar os termos de referência e contratar empresas para a elaboração do estudo da etapa técnica propositiva e do enquadramento dos trechos/bacias selecionados pelos CBHs (Fluxograma da ação 1.2.3.2.)</p> <p>Elaborar o termo de referência e contratar empresa para elaboração estudo da etapa técnica propositiva do Enquadramento</p>
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 1.750.000,00

Recomendações	-
---------------	---

Indicador de desempenho				
	Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
	nenhuma reunião realizada	2022	0	0,25
	designar técnico da ED para acompanhamento	2023	0,25	0
	subsidiar o estudo com dados técnicos	2024	0,5	0



presença do CBH em 70% dos eventos previstos	2024	0,75	0
estudo técnico apresentado ao comitê	2025	1	0




Ação 1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.3 - Enquadramento
Meta	Elaboração e aprovação de proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação para a RH III, entre o 3º e 8º ano de implementação do PBH.
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
Termo de referência elaborado	2025	0,25	0
Proposta e programa em andamento	2026	0,5	0
Proposta e programa concluídos	2028	0,75	0

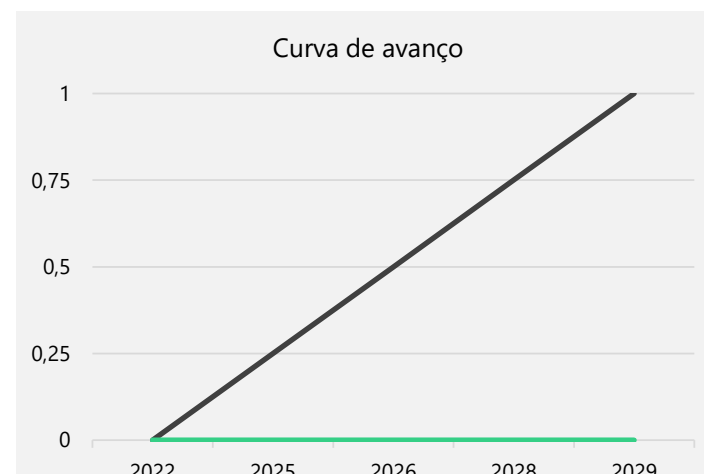

Proposta e programa aprovados

2029

1

0

2022 2023 2024 2025 2029


— Nota prevista — Nota obtida

Ação 1.2.4.1 - Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano


Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.4 - Plano de Bacia Hidrográfica
Meta	Criação e operação do GAP por toda a vigência do PBH, por meio de reuniões semestrais
Atividades previstas	Deliberar sobre a criação de Grupo de Acompanhamento da execução dos PBHs ou PDRHs Realizar reuniões periódicas de avaliação do andamento dos PBHs e PDRHs Elaborar informe do andamento da execução dos PBHs e PDRHs (Ação 1.2.4.3 dos PBHs e PDRHs) Divulgar andamento da execução dos PBHs e PDRHs
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	Deliberar sobre a criação de Grupo de Acompanhamento da execução dos PBHs ou PDRHs Realizar reuniões periódicas de avaliação do andamento dos PBHs e PDRHs Elaborar informe do andamento da execução dos PBHs e PDRHs (Ação 1.2.4.3 dos PBHs e PDRHs) Divulgar andamento da execução dos PBHs e PDRHs		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida



nenhuma reunião realizada	2022	0	0
8 reuniões realizadas	2025	0,25	0
16 reuniões realizadas	2029	0,5	0
24 reuniões realizadas	2033	0,75	0
30 reuniões realizadas	2036	1	0

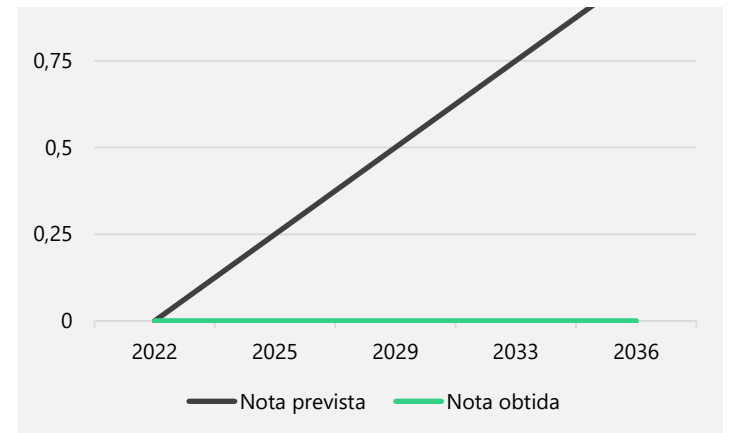


Ação 1.2.4.2 - Realizar atualizações periódicas do orçamento, a cada 5 anos, e atualização completa do Plano de Bacia a partir 12º ano.

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.4 - Plano de Bacia Hidrográfica
Meta	Realização de 2 atualizações do orçamento do PBH e 1 atualização completa do PBH, durante o prazo de implementação do PBH (15 anos)
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 500.000,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atualização realizada	2022	0	0
pelo menos 1 atualização do orçamento realizada	2026	0,25	0
pelo menos 2 atualizações do orçamento realizadas	2031	0,5	0
pelo menos 2 atualizações do orçamento realizadas e revisão completa em andamento	2033	0,75	0

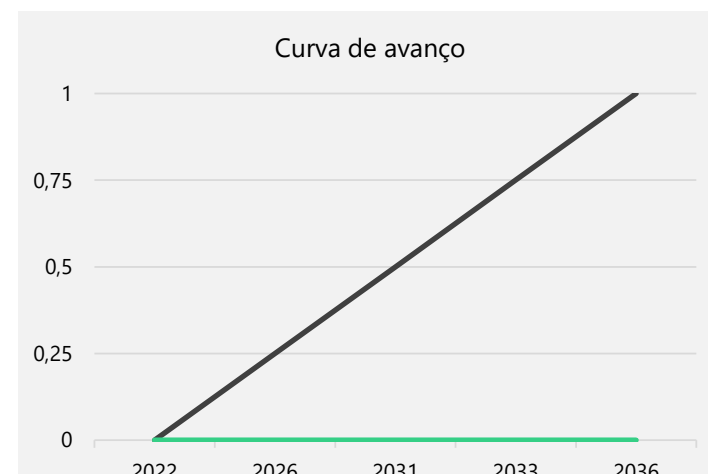

pelo menos 2 atualizações do orçamento e 1 atualização do PBH realizadas

2036

1

0

2022 2020 2021 2023 2020

— Nota prevista — Nota obtida

Ação 1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.4 - Plano de Bacia Hidrográfica
Meta	Realizar 15 divulgações da situação de implementação do PBH
Atividades previstas	Elaborar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH Apresentar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH na plenária do CBH Divulgar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, em atraso		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	Elaborar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma divulgação realizada	2022	0	0
4 divulgações realizadas	2025	0,25	0
8 divulgações realizadas	2029	0,5	0



12 divulgações realizadas	2033	0,75	0
15 divulgações realizadas	2036	1	0



Ação 1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH


Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.5 - Sistema de Informações
Meta	Manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH III durante a vigência do PBH
Atividades previstas	Encaminhar demandas de manutenção e atualização do SIGA Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do SIGA Acompanhar a contratação Apresentar prestação de contas do andamento do contrato nos CBHs
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 600.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	Encaminhar demandas de manutenção e atualização do SIGA Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do SIGA Acompanhar a contratação		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho				
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida	
sistema sem funcionamento	2022	0	0	
sistema em funcionamento durante quarto anos	2025	0,25	0	



sistema em funcionamento durante oito anos	2029	0,5	0
sistema em funcionamento durante doze anos	2033	0,75	0
sistema em funcionamento em todos anos da vigência do PBH	2036	1	0

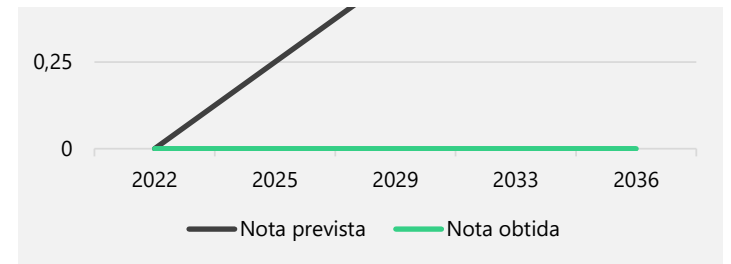


Ação 1.3.1.1 - Estudar, pactuar e propor a criação de Unidades Especiais de Gestão (UEGs) e definir as necessidades de manejo diferenciado e possíveis restrições de uso

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.3 - Unidades Especiais de Gestão (UEGs)
Programa	1.3.1 - Criação de UEGs e Indicação de Manejos Diferenciados
Meta	Estudo e proposta de UEGs entre o 3º e 8º ano de vigência do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
1 reunião relativa as UEGs realizada	2024	0,25	0
1 oficina realizada	2025	0,5	0
proposta de UEGs concluída	2027	0,75	0
proposta de UEGs apresentada ao órgão gestor	2029	1	0

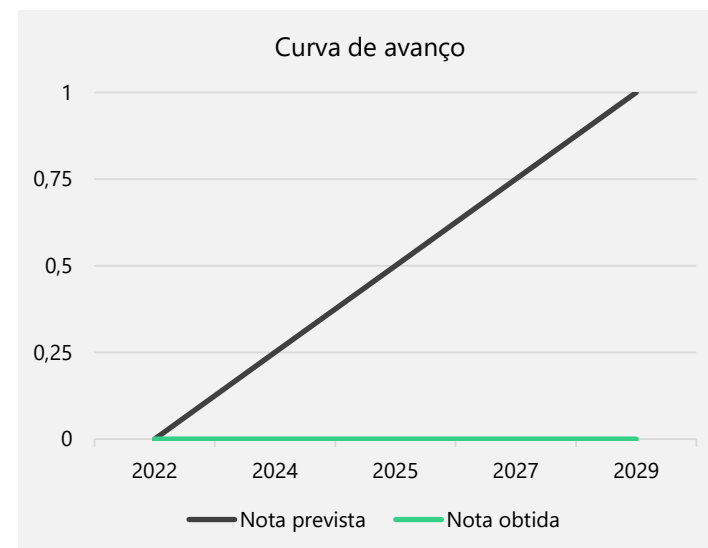


Ação 1.4.1.1 - Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.4 - Eventos Críticos
Programa	1.4.1 - Plano de Gerenciamento de Riscos
Meta	Divulgação do Plano de Gerenciamento de Riscos aos órgãos pertinentes de sua área de atuação
Atividades previstas	Participar de reuniões, eventos e contribuir na elaboração do PGR da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 878.404,03

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	Participar de reuniões, eventos e contribuir na elaboração do PGR da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
1 oficina realizada	2024	0,25	0
1 reunião realizada	2025	0,5	0
proposta de divulgação elaborada	2025	0,75	0
divulgação realizada	2026	1	0

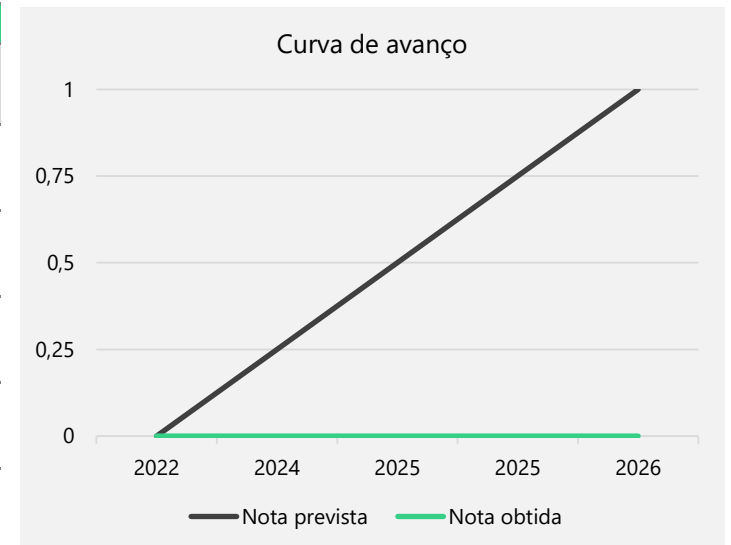

Ação 1.4.1.2 - Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.4 - Eventos Críticos
Programa	1.4.2 - Ações emergenciais
Meta	-
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 50.000,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	-		
Principais constatações	Não foi identificada necessidade de atuação do CBH em eventos críticos no exercício.		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho				
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	



Ação 2.1.1.1 - Subsidiar a elaboração do estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

Ação	
Agenda	2 - Recursos Hídricos - quali-quantitativo
Subagenda	2.1 - Água Superficial
Programa	2.1.1 - Equacionamento de Problemas de Balanço Hídrico Quali-quantitativo
Meta	Levantamento das informações sobre os problemas de balanço hídrico para subsídio do estudo da ação 2.1.1.1 do PIRH, entre o 5º e 9º ano de implementação do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 3.040.000,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
1 reunião realizada	2026	0,25	0
1 oficina realizada	2027	0,5	0
consolidação das informações concluída	2028	0,75	0



Envio das informações ao CEIVAP

2030

1

0

2022 2020 2021 2020 2030


— Nota prevista — Nota obtida

Ação 2.2.1.1 - Subsidiar a elaboração do estudo sobre a água subterrânea na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

Ação	
Agenda	2 - Recursos Hídricos - quali-quantitativo
Subagenda	2.2 - Água Subterrânea
Programa	2.2.1 - Uso Sustentável da Água Subterrânea
Meta	Levantamento das informações sobre os problemas de balanço hídrico com vistas a subsidiar o estudo da ação 2.2.1.1, entre o 6º e 9º ano de implementação do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 2.680.000,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
1 reunião realizada	2027	0,25	0
1 oficina realizada	2027	0,5	0
consolidação das informações concluída	2028	0,75	0

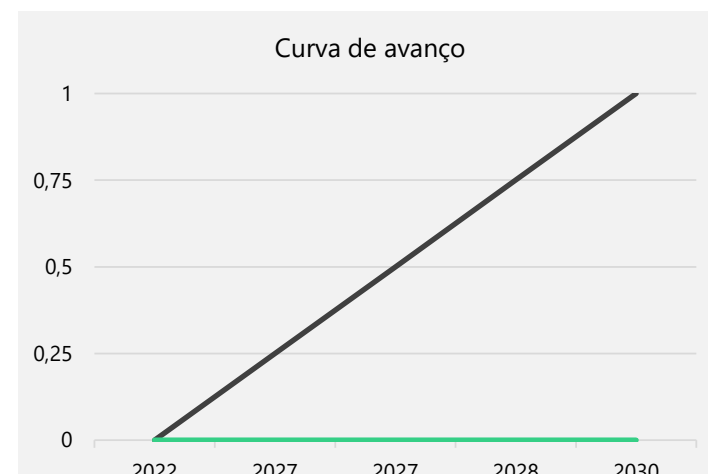

Envio das informações ao CEIVAP

2030

1

0

2022 2021 2021 2020 2020

— Nota prevista — Nota obtida

Ação 2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente

Ação	
Agenda	2 - Recursos Hídricos - quali-quantitativo
Subagenda	2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial e subterrânea
Programa	2.3.1 - Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa existente
Meta	Oficiar, 5 vezes, os órgãos mantenedores das redes de monitoramento existente quanto a situação da operação do monitoramento quantitativo da água superficial, durante a vigência do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum ofício encaminhado	2022	0	0
1º ofício encaminhado	2024	0,25	0
2º ofício encaminhado	2027	0,5	0




3º ofício encaminhado	2030	0,75	0
5º ofício encaminhado	2036	1	0




Ação 2.3.2.1 - Desenvolver o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos

Ação		Resultados		
Agenda	2 - Recursos Hídricos - quali-quantitativo	Status da execução	Concluída	
Subagenda	2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial e subterrânea	Nota prevista	0,25	Nota alcançada 0,25
Programa	2.3.2 - Melhoria, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	Atividades executadas	Criar e formalizar Grupo de Trabalho para desenvolvimento do Plano de Monitoramento, abrangendo todos os atores pertinentes, especialmente os órgãos gestores Realizar reuniões do Grupo de Trabalho Organizar 2 capacitações de Manuseio e Calibração da Sonda	
Meta	Elaboração do Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos entre o 1º e 4º ano de vigência do PBH	Principais constatações	-	
Atividades previstas	Criar e formalizar Grupo de Trabalho para desenvolvimento do Plano de Monitoramento, abrangendo todos os atores pertinentes, especialmente os órgãos gestores Realizar reuniões do Grupo de Trabalho Organizar 2 capacitações de Manuseio e Calibração da Sonda	Recomendações	-	
Prazo para as atividades	Ano do exercício			
Responsáveis	CBH; AGEVAP			
Custo estimado	R\$ 0,00			

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida



nenhuma atividade realizada	2022	0	0,25
termo de referência concluído	2022	0,25	0,25
empresa contratada e plano em elaboração	2023	0,5	0,25
plano concluído	2024	0,75	0,25
plano apresentado ao comitê	2025	1	0,25

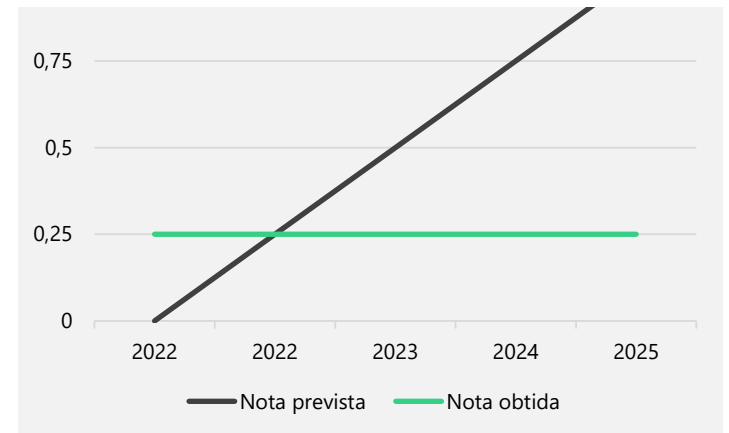

Ação 2.3.2.2 - Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento

Ação		Resultados			
Agenda	2 - Recursos Hídricos - quali-quantitativo	Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Subagenda	2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial e subterrânea	Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Programa	2.3.2 - Melhoria, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	Atividades executadas	-		
Meta	Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos a partir do 5º ano até o 15º ano de implementação do PBH.	Principais constatações	-		
Atividades previstas	Definir as ações constantes do Plano de Monitoramento a serem realizadas pelo comitê Avaliar a rede de monitoramento existente Elaborar o termo de referência e realizar a contratação	Recomendações	-		
Prazo para as atividades	Ano do exercício				
Responsáveis	CBH; AGEVAP				
Custo estimado	R\$ 430.000,00				

Indicador de desempenho			
	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
termo de referência concluído	2024	0,25	0
empresa contratada e sistema em implementação	2025	0,5	0



sistema de monitoramento concluído	2027	0,75	0
sistema de monitoramento operando	2027	1	0



Ação 3.1.1.1 - Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário


Ação	
Agenda	3 - Saneamento Urbano e Rural
Subagenda	3.1 - Esgotamento Sanitário
Programa	3.1.1 - Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário
Meta	Assinatura de 5 acordos de cooperação técnica com os municípios hierarquizados para elaboração de estudos, projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário
Atividades previstas	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios selecionados e hierarquizados conforme Resolução CBH-MPS 103/2021 Elaborar e divulgar o ato convocatório para contratação de empresas especializadas para elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário Acompanhar a elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo do sistema de esgotamento sanitário
Prazo para as atividades	Ano do exercício

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	1
Atividades executadas	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios selecionados e hierarquizados conforme Resolução CBH-MPS 103/2021 Elaborar e divulgar o ato convocatório para contratação de empresas especializadas para elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário		
Principais constatações	Projetos de Quatis, Porto Real, Itatiaia e Rio das Flores em fase de elaboração. Acordos assinados com os municípios de Três Rios, Barra do Piraí, Mendes, Porto Real, Rio das Flores e Volta Redonda. Contrato para elaboração dos projetos em fase de assinatura.		
Recomendações	-		

Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 9.114.068,54



Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum estudo ou projeto realizado	2022	0	1
1 acordo assinado ou projeto realizado	2025	0,25	0
2 acordos assinados ou projetos realizados	2029	0,5	0
3 acordos assinados ou projetos realizados	2033	0,75	0
5 acordos assinados ou projetos realizados	2036	1	0

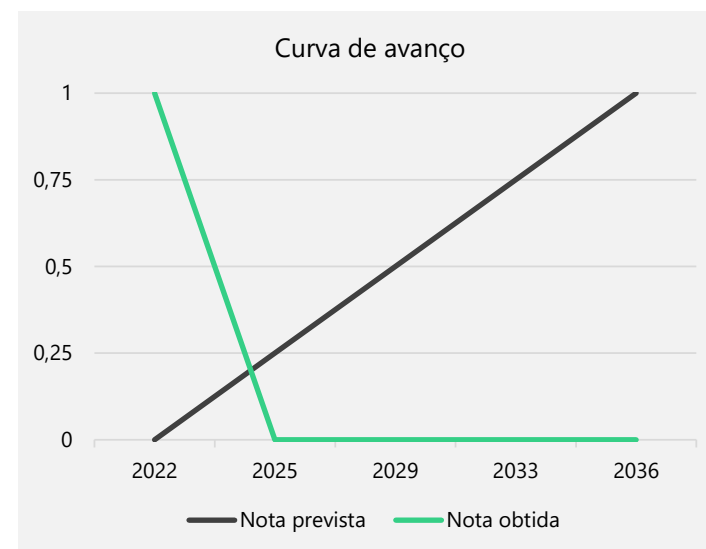


Ação 3.1.1.2 - Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário

Ação	
Agenda	3 - Saneamento Urbano e Rural
Subagenda	3.1 - Esgotamento Sanitário
Programa	3.1.1 - Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário
Meta	Assinatura de 5 acordos de cooperação técnica com os municípios hierarquizados para execução de estudos, projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário
Atividades previstas	Elaborar e divulgar edital de chamamento público, considerando prioridades para investimento do PBH Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios selecionados e hierarquizados Elaborar e divulgar o ato convocatório para contratação de empresas especializadas para execução de projetos para sistemas de esgotamento sanitário alternativos, isolados e/ou descentralizados periurbanos e rururbanos e, ainda, de projetos para sistemas Acompanhar a execução de projetos para sistemas de esgotamento sanitário alternativos, isolados e/ou descentralizados periurbanos e rururbanos e, ainda, de projetos para sistemas de esgotamento sanitário rurais
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 3.274.946,23

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	Elaboração de minuta de Edital		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum estudo ou projeto realizado	2022	0	0
1 acordo assinado ou projeto realizado	2027	0,25	0
2 acordos assinados ou projetos realizados	2029	0,5	0
3 acordos assinados ou projetos realizados	2033	0,75	0
5 acordos assinados ou projetos realizados	2036	1	0

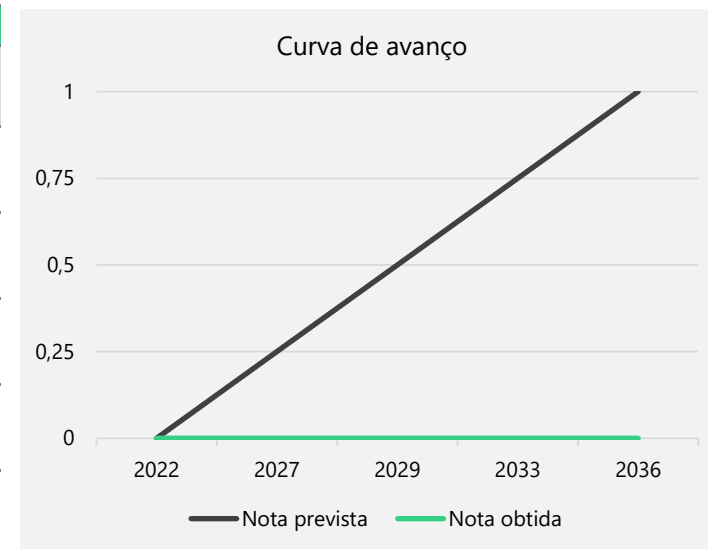


Ação 3.1.1.3 - Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP)


Ação	
Agenda	3 - Saneamento Urbano e Rural
Subagenda	3.1 - Esgotamento Sanitário
Programa	3.1.1 - Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário
Meta	Emissão de carta de contrapartida a 3 municípios ao longo da vigência do PBH
Atividades previstas	Deliberar a destinação de contrapartida Assinar o instrumento contratual com os municípios Transferir os recursos ao Município via Operador Financeiro Realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras Acompanhar as obras em andamento Informar aos CBHs do andamento dos investimentos e obras
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 3.274.946,23

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	1
Atividades executadas	Deliberar a destinação de contrapartida Assinar o instrumento contratual com os municípios Transferir os recursos ao Município via Operador Financeiro		
Principais constatações	Contrato de Transferência assinado com o município de Volta Redonda no contexto do Protratar. Primeira parcela da contrapartida já foi transferida.		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida



nenhuma carta emitida	2022	0	1
1 carta emitida	2025	0,25	1
2 cartas emitidas	2029	0,5	1
2 cartas emitidas	2033	0,75	1
3 cartas emitidas	2036	1	1

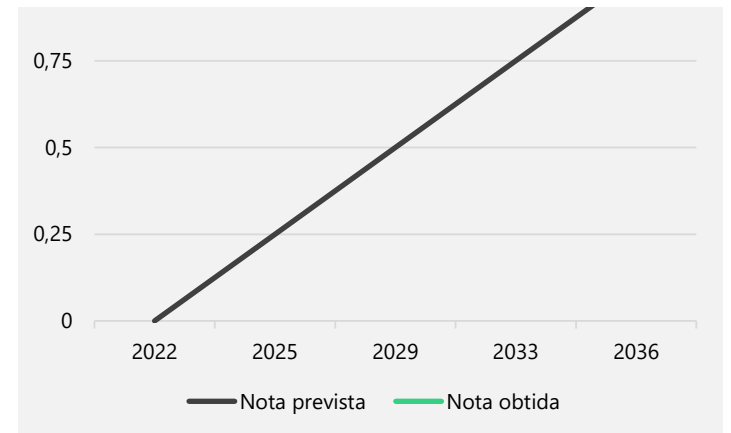


Ação 3.2.1.1 - Viabilizar relatório sobre resíduos sólidos para divulgação aos órgãos pertinentes

Ação	
Agenda	3 - Saneamento Urbano e Rural
Subagenda	3.2 - Resíduos Sólidos
Programa	3.2.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento das Áreas de Disposição Final de Resíduos Sólidos
Meta	Divulgação de informações com base no estudo realizado no âmbito do PIRH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 4.460.000,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
1 oficina realizada	2031	0,25	0
1 reunião realizada	2032	0,5	0
proposta de divulgação elaborada	2032	0,75	0
divulgação realizada	2033	1	0

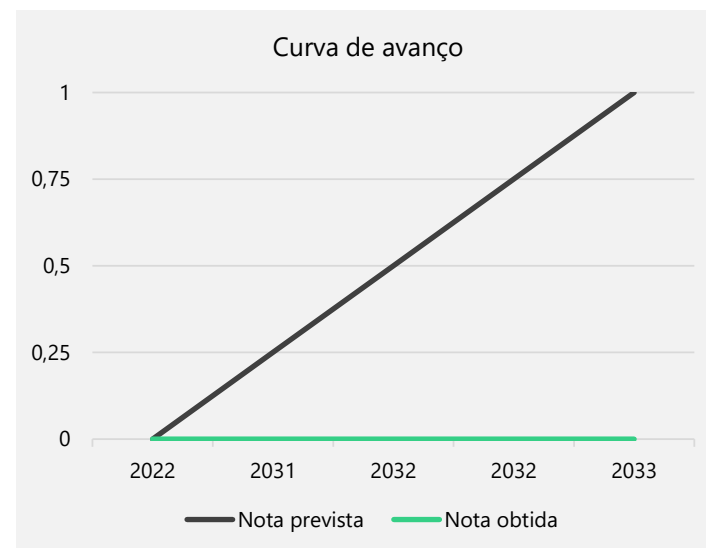


Ação 3.3.1.1 - Viabilizar relatório sobre drenagem urbana para divulgação aos órgãos pertinentes

Ação	
Agenda	3 - Saneamento Urbano e Rural
Subagenda	3.3 - Drenagem Urbana
Programa	3.3.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Drenagem Urbana
Meta	Divulgação de informações com base no levantamento realizado no âmbito do PIRH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 1.475.000,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
1 oficina realizada	2035	0,25	0
1 reunião realizada	2035	0,5	0
proposta de divulgação elaborada	2036	0,75	0
divulgação realizada	2036	1	0

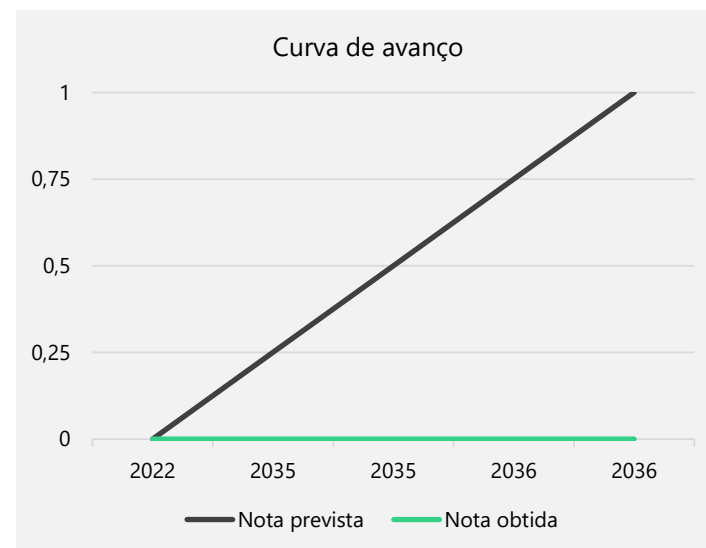

Ação 4.1.1.1 - Formalizar a indicação de bacias hidrográficas prioritárias para elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos


Ação	
Agenda	4 - Infraestrutura verde
Subagenda	4.1 - Planejamento Territorial
Programa	4.1.1 - Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias
Meta	Formalização das bacias hidrográficas prioritárias
Atividades previstas	Fazer a indicação de bacias prioritárias para atuação do programa MANANCIAIS (baseado nos estudos dos PBHs e PDRHs) Analisar e definir a possibilidade de aporte de recurso conjunto Acompanhar a contratação e a elaboração dos projetos
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0,5	Nota alcançada	1
Atividades executadas	Fazer a indicação de bacias prioritárias para atuação do programa MANANCIAIS (baseado nos estudos dos PBHs e PDRHs) Analisar e definir a possibilidade de aporte de recurso conjunto Acompanhar a contratação e a elaboração dos projetos		
Principais	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho				
	Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
	nenhuma atividade realizada	2022	0	1
	1ª reunião realizada	2022	0,25	1



2ª reunião realizada	2022	0,5	1
proposta de formalização elaborada	2023	0,75	0
formalização realizada	2023	1	0

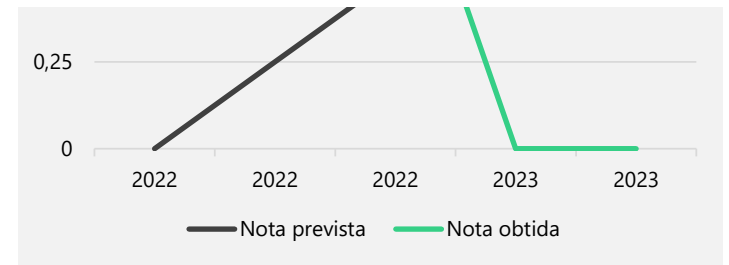


Ação 4.1.1.2 - Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos

Ação	
Agenda	4 - Infraestrutura verde
Subagenda	4.1 - Planejamento Territorial
Programa	4.1.1 - Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias
Meta	Desenvolvimento de 2 estudos, planos ou projetos com vistas à recuperação ambiental e ao manejo correto do solo voltados a preservação dos recursos hídricos
Atividades previstas	Disponibilizar recurso, a título de contrapartida para investimentos na secretaria executiva do Programa Mananciais do CEIVAP (Elaboração dos PRISMAS)
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 3.470.000,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0,25	Nota alcançada	0,25
Atividades executadas	Disponibilizar recurso, a título de contrapartida para investimentos na secretaria executiva do Programa Mananciais do CEIVAP (Elaboração dos PRISMAS)		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho				
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida	
nenhum estudo, plano ou projetos realizado	2022	0	0,25	
1º estudo, plano ou projeto contratado	2022	0,25	0,25	
1º estudo, plano ou projeto concluído	2023	0,5	0	
2º estudo, plano ou projeto contratado	2026	0,75	0	

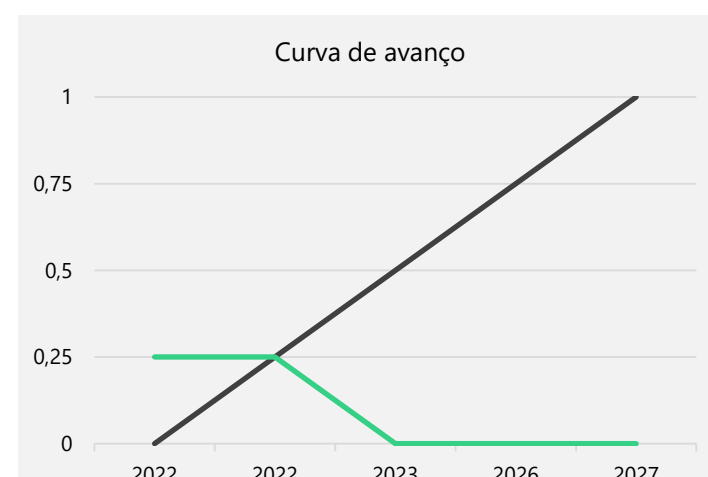

2º estudo, plano ou projeto concluído

2027

1

0

2022 2022 2023 2020 2021

— Nota prevista — Nota obtida

Ação 4.1.2.1 - Identificar, mobilizar e formalizar acordos e parcerias com vistas à execução de ações de recuperação ambiental e manejo do solo

Ação	
Agenda	4 - Infraestrutura verde
Subagenda	4.1 - Planejamento Territorial
Programa	4.1.2 - Mobilização Social visando à Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias
Meta	Formalização de 2 acordos de cooperação técnica com instituições estratégicas durante a vigência do PBH
Atividades previstas	Apoiar a identificação e formalização de parcerias para implantação dos projetos de conservação e reabilitação Formalizar parcerias para a implantação de projetos de conservação e reabilitação
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	Acordos assinados com a Prefeitura de Barra do Pirai.		
Principais constatações	Atividades realizadas no âmbito do Mananciais.		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum acordo realizado	2022	0	0
1º acordo em discussão	2025	0,25	0
1º acordo realizado	2029	0,5	0
2º acordo em discussão	2034	0,75	0



2º acordo realizado

2036

1

0

2022 2023 2029 2034 2030

— Nota prevista — Nota obtida

Ação 4.2.1.1 - Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos


Ação	
Agenda	4 - Infraestrutura verde
Subagenda	4.2 - Intervenções na Paisagens
Programa	4.2.1 - Execução de planos e projetos de conservação e preservação
Meta	Execução de 2 projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos
Atividades previstas	Analisar e definir a possibilidade de aporte de recurso conjunto Executar os projetos de conservação e reabilitação Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais Acompanhar as ações estruturais Participar das ações estruturais
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 360.000,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	Analisar e definir a possibilidade de aporte de recurso conjunto		
Principais constatações	A contrapartida do Comitê ao projeto Mananciais na RH-III está sendo realizada por meio da contratação do projeto de esgotamento sanitário de Ipiabas. A elaboração do projeto está em fase de assinatura de contrato.		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho				
	Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
	nenhuma ação realizada	2022	0	0
	1º projeto em andamento	2026	0,25	0



1º projeto finalizado	2029	0,5	0
2º projeto em andamento	2032	0,75	0
2º projeto finalizado	2036	1	0

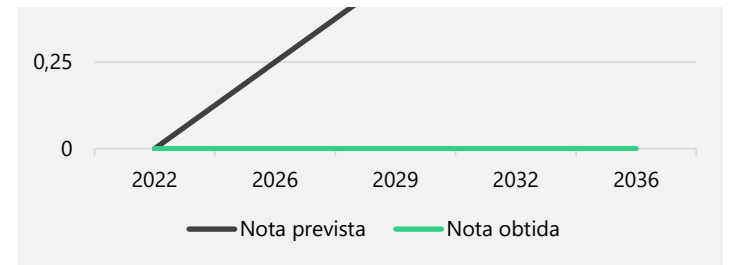

Ação 5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos


Ação	
Agenda	5 - Produção de conhecimento
Subagenda	5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico
Programa	5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão
Meta	Formalização de 5 instrumentos na vigência do PBH
Atividades previstas	Elaborar e publicar o Edital de Chamamento Público para concessão de auxílio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico Formalizar instrumentos com IEs e/ou pesquisadores para produção do conhecimento técnico e científico de interesse para a gestão de recursos hídricos, nos temas pertinentes ao PBH
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 1.200.000,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0,5
Atividades executadas	Formalizar instrumentos com IEs e/ou pesquisadores para produção do conhecimento técnico e científico de interesse para a gestão de recursos hídricos, nos temas pertinentes ao PBH		
Principais constatações	Foram assinados 3 convênios de custeio de projetos de pesquisa com a UFF, que se encontram em andamento.		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho				
	Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
	nenhum instrumento formalizado	2022	0	0,5
	1 instrumento formalizado	2025	0,25	0,5



3 instrumentos formalizados	2029	0,5	0,5
4 instrumentos formalizados	2033	0,75	0,5
5 instrumentos formalizados	2036	1	0,5

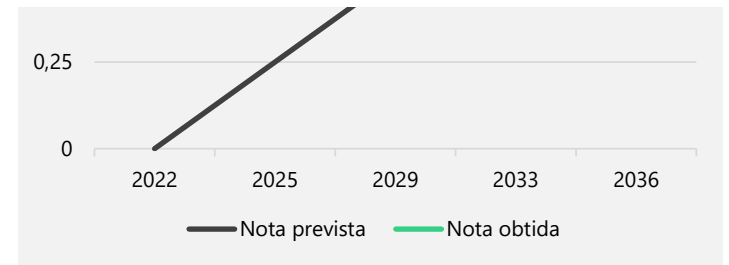


Ação 5.1.2.1 - Realizar a atualização do Atlas de microbacias do Médio Paraíba do Sul

Ação	
Agenda	5 - Produção de conhecimento
Subagenda	5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico
Programa	5.1.2 - Elaboração de Estudos Técnicos
Meta	Realizar 1 atualização do Atlas de Microbacias
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 100.000,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	-		
Principais	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
elaboração de TDR	2024	0,25	0
empresa contratada	2024	0,5	0
contrato em andamento	2025	0,75	0
atualização concluída	2025	1	0

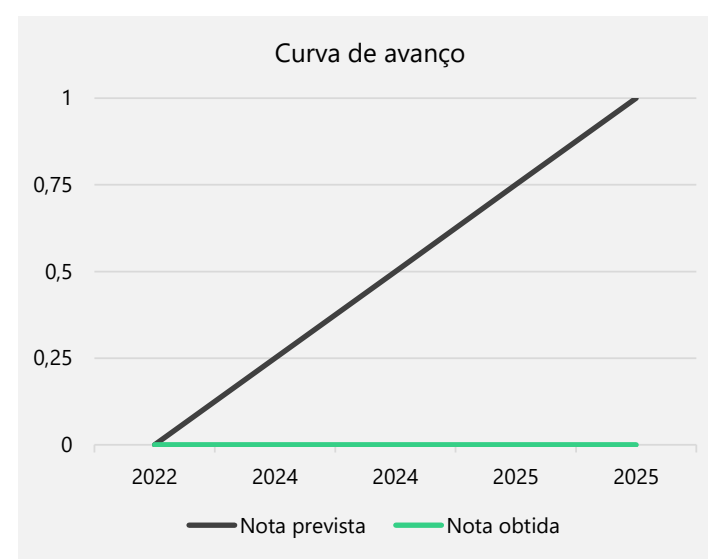


Ação 6.1.1.1 - Realizar a revisão do Plano de Ações de Comunicação

Ação	
Agenda	6 - Comunicação e Educação Ambiental
Subagenda	6.1 - Comunicação
Programa	6.1.1 - Gestão de Comunicação
Meta	Realização de 7 revisões do Plano de Ações de Comunicação
Atividades previstas	Realizar a revisão do Plano de Comunicação Apresentar e aprovar a revisão do Plano de Comunicação na plenária do CBH
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	Realizar a revisão do Plano de Comunicação Apresentar e aprovar a revisão do Plano de Comunicação na plenária do CBH		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma revisão realizada	2022	0	0
1ª revisão realizada e 2ª revisão em andamento	2025	0,25	0
3ª revisão realizada e 4ª revisão em andamento	2029	0,5	0
5ª revisão realizada e 6ª revisão em andamento	2033	0,75	0

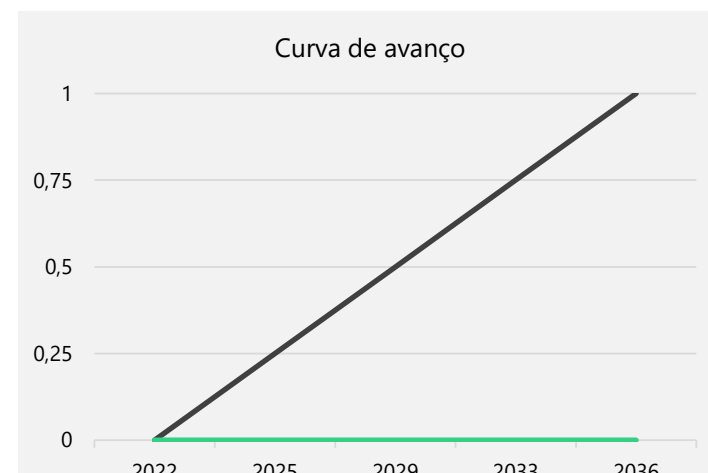

7ª revisão realizada

2036

1

0

2022 2023 2024 2025 2026


— Nota prevista — Nota obtida

Ação 6.1.1.2 - Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação


Ação	
Agenda	6 - Comunicação e Educação Ambiental
Subagenda	6.1 - Comunicação
Programa	6.1.1 - Gestão de Comunicação
Meta	Executar 70% das atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação
Atividades previstas	Executar as atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação Elaborar relatório contendo comprovação da execução das atividades Apresentar relatório na plenária do CBH
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 300.000,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0
Atividades executadas	Executar as atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação Elaborar relatório contendo comprovação da execução das atividades Apresentar relatório na plenária do CBH Contratar empresa especializada em edição e produção de vídeos (institucional e educativos) Acompanhamento do contrato com empresa especializada em edição e produção de vídeos (institucional e educativos)		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida



nenhum relatório entregue	2022	0	0
4 relatórios entregues	2025	0,25	0
8 relatórios entregues	2029	0,5	0
12 relatórios entregues	2033	0,75	0
15 relatórios entregues	2036	1	0

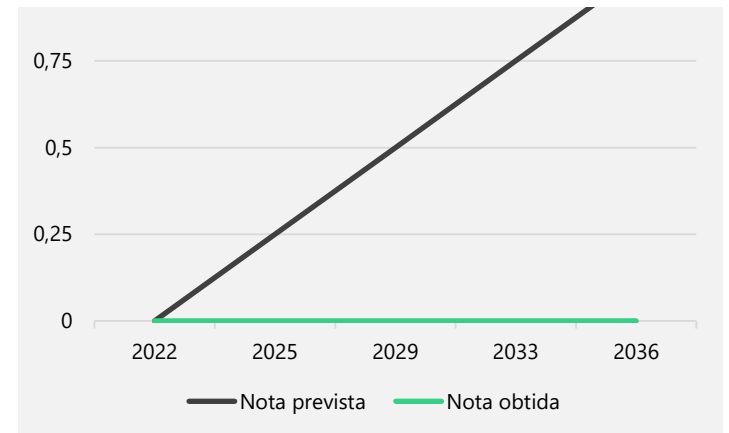


Ação 6.2.1.1 - Elaborar o Plano de Educação Ambiental


Ação	
Agenda	6 - Comunicação e Educação Ambiental
Subagenda	6.2 - Educação Ambiental
Programa	6.2.1 - Programa de Educação ambiental
Meta	Elaboração do plano de educação ambiental entre o 1º e 4º ano de vigência do PBH
Atividades previstas	Criar CT-EA Elaborar o plano de trabalho e as diretrizes para o Plano de Educação Ambiental
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0,5	Nota alcançada	0,5
Atividades executadas	Criar CT-EA Elaborar o plano de trabalho da CT-EA Elaborar as diretrizes para a contratação do profissional para elaboração do Plano de Educação Ambiental Aprovar a contratação do profissional em plenária Aprovar o perfil do profissional em Diretoria e encaminhar carta solicitando a contratação a Diretoria da AGEVAP AGEVAP solicitar autorização do INEA para realizar a contratação/Retorno do INEA		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho				
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida	
nenhuma atividade realizada	2022	0	0,5	



plano de trabalho definido	2025	0,25	0
diretrizes para o PEA definidas	2022	0,5	0
PEA em elaboração	2023	0,75	0
plano finalizado	2025	1	0

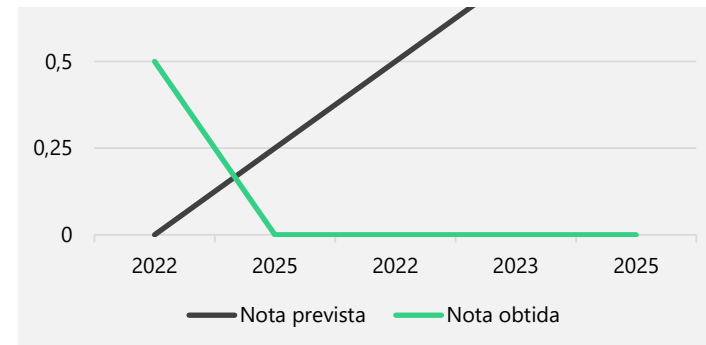

Ação 6.2.1.2 - Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental

Ação	
Agenda	6 - Comunicação e Educação Ambiental
Subagenda	6.2 - Educação Ambiental
Programa	6.2.1 - Programa de Educação ambiental
Meta	Realização de 11 ações de educação ambiental
Atividades previstas	Mobilizar e organizar ações de educação ambiental conforme orientações do Plano de EA Realizar ações de educação ambiental Apresentar relatório de acompanhamento do Plano de EA na plenária do CBH
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 700.000,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0	Nota alcançada	0,25
Atividades executadas	Mobilizar e organizar ações de educação ambiental conforme orientações do Plano de EA Realizar ações de educação ambiental Apresentar relatório de acompanhamento do Plano de EA na plenária do CBH Acompanhamento - Edital I - Projetos de Auxílio à Educação Ambiental - Projeto Olhos Verdes Acompanhamento Cílios do Paraíba - Itatiaia Acompanhamento Cílios do Paraíba - Quatis Apoiar a realização da Expedição Nascentes do Paraíba na região hidrográfica III Em andamento - Contratar profissional temporário para elaboração do Plano Educação Ambiental Organizar e realizar o Simpósio Água Boa		
Principais	-		
Recomendações	-		
